UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS · OGPL · OFICINA DE RACIONALIZACIÓN

Plan de gestión de la Fase 1 · Identificación y documentación de procesos

P01-PG-F1 · Versión 3.0

Código	P01-PG-F1
Versión	3.0 · 2026-10-08
Proyecto	P01 · Implementación de la Gestión por Procesos en la UNMSM
Fase	Fase 1 · Identificación
Estado	En validación
Partes validadas	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, A, B
Actividades cumplidas	23 de 26
Aprueba	Jefe de la OGPL
Compuerta	100 % de los Anexos 1 y 3 registrados por la facultad (0,5 × Anexo 1 + 0,5 × Anexo 3) y MAGPROF validado. Se evalúa por facultad (F1-D-04).
Última actualización	2026-10-13
Nota de versión	Reemplaza a la v2.0 del 26/08/2026. Reformulada con la misma estructura que el plan de la Fase 2; lo que era de otras fases pasó a sus planes.

Contenido

1. Datos del documento
2. 1. Propósito del plan
3. 2. Decisiones adoptadas en esta versión
4. 3. Enunciado del alcance
5. 4. Estructura de desglose del trabajo (EDT / WBS)
6. 5. Matriz de trazabilidad de requisitos
7. 6. Criterios de aceptación
8. 7. Roles y responsabilidades (RACI)
9. 8. Control de cambios
10. 9. Gestión del cronograma
11. 10. Gestión de la calidad
12. 11. Gestión de riesgos
13. 12. Interesados y comunicaciones
14. 13. Documentos que integran este plan
15. 14. Cronograma detallado de la Fase 1: Identificación
16. Anexo A. Correspondencia con la Guía del PMBOK 7.ª edición
17. Anexo B. Arquitectura de planes y gobernanza del proyecto P01

Datos del documento

CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA	ELABORADO POR	APROBADO POR
P01-PG-F1	V3.0	08/10/2026	Analista Líder/Senior · Alvaro Rojas Carnero	Jefe de la OGPL

INICIO DEL PROYECTO	CIERRE DE LA FASE 1	CIERRE DEL PROYECTO (FASES 1 A 3)	AVANCE DE LA FASE 1
01/06/2025	30/09/2026 (compuerta G1)	30/06/2027	77,7 % al 26/08/2026 (v2.0)

Estado del documento: Versión reformulada y actualizada en concordancia con el plan de la Fase 2. Este documento forma parte de la arquitectura de gestión del proyecto —alineada con el estándar PMBOK 7.ª edición y compuesta por tres planes específicos correspondientes a cada fase, según se detalla en el Anexo B — y mantiene la estructura unificada de 14 secciones compartida con los demás planes.

1. Propósito del plan

Este plan establece las directrices para definir, desarrollar, supervisar y controlar la **Fase 1: Identificación** del proyecto, cuyo producto central es el Manual de Gestión por Procesos de cada Facultad (MAGPROF), elaborado bajo la Norma Técnica N.º 002-2025-PCM-SGP. La fase comprende la identificación de los procesos estándar de nivel 0, el Mapa de Procesos Estándar, el registro de los Anexos 1 (inventario) y 3 (caracterización), los indicadores estándar por proceso y la puesta en marcha del SIGPRO en modo consulta.

Para asegurar su factibilidad, el plan integra una gestión transversal de calidad, recursos, comunicaciones, riesgos e interesados, y centraliza la directriz operativa para que sea la fuente de la toma de decisiones de la fase.

Es el primero de los cuatro planes de fase del proyecto (Según el Anexo B). Comparte estructura con el plan de la Fase 2 y fija la **compuerta G1**: solo las facultades que completan al 100 % la Fase 1 pasan a la Fase 2 (D-04). .

2. Decisiones adoptadas en esta versión

Este apartado documenta las decisiones técnicas y operativas adoptadas durante el proyecto para optimizar la planificación, mitigar riesgos, cerrar las contradicciones operativas detectadas y garantizar el cumplimiento del cronograma.

CÓDIGO	FECHA	DECISIÓN ADOPTADA
D-01	08/09/2026	**Modificación en el registro de anexos (derogación del Anexo 2):** Los anexos a completar serán el Anexo 1 (Inventario de Productos y Procesos) y el Anexo 3 (Ficha Técnica de Producto y Proceso), dado que se están conectando las hojas de cálculo de Google Sheets al SIGPRO. Como el Anexo 2 contiene obligatoriamente celdas combinadas que el sistema no puede conectar, su contenido ya no se registra.
D-02	08/09/2026	**Alcance de la documentación de la gestión por procesos:** Está dentro del alcance la documentación que cada facultad registra y actualiza en el Anexo 1 y el Anexo 3. Está fuera la documentación de procesos de dependencias centrales de la universidad ajenas a las facultades.
D-03	08/09/2026	**Despliegue del SIGPRO en las fases:** El SIGPRO en modo consulta se habilita dentro de la Fase 1. El backend y los módulos de visualización de los Anexos 1 y 3, indicadores, encuestas, automatización del reporte de indicadores y el despliegue completo se ejecutan en la Fase 2.
D-04	08/09/2026	**Cierre de la Fase 1 y requisito para avanzar:** El 30 de setiembre de 2026 es la fecha límite de cierre de la Fase 1. Pasan a la Fase 2 las facultades que completen al 100 % el registro de los Anexos 1 y 3. Para transitar a cualquier fase siguiente se debe cumplir el 100 % de las fases previas; las facultades con registros pendientes permanecen en su fase hasta culminarla.

CÓDIGO	FECHA	DECISIÓN ADOPTADA
D-05	08/09/2026	**Monitoreo continuo a través del Dashboard:** La medición del avance se realiza mediante una revisión interna y su estado se visualiza de manera continua en el Dashboard de SIGPRO.
D-06	08/09/2026	**Catálogo único de procesos de nivel 0 y Mapa Estándar:** Se establece un catálogo único de 16 procesos de nivel 0, con excepción de PE.03 y PS.08, cuya ejecución no aplica a todas las facultades. El mapa estándar vigente se consulta en SIGPRO.
D-07	08/09/2026	**Ruta de validación y aprobación institucional del MAGPROF:** (1) la UPPR u OCAA de la facultad consolida y verifica el documento; (2) la Oficina de Racionalización (OGPL) revisa el expediente y emite opinión técnica favorable; (3) el Consejo de Facultad lo aprueba mediante Resolución Decanal; (4) la Dirección General de Administración lo ratifica mediante Resolución Directoral para su publicación y difusión.
D-08	08/09/2026	**Correlación de la codificación:** Los procesos de soporte emplean obligatoriamente la correlación PS.01 a PS.10. El código de cada proceso es único y no transferible: si una facultad carece de PS.08, el identificador queda vacante; no se permite recorrer la numeración ni renombrar PS.09 como PS.08.
D-09	30/09/2026	**Resultado de la compuerta G1 para el primer grupo:** FDCP, FPSIC, FIEE y FCA cumplieron la Fase 1 al 30 de setiembre de 2026 y pasan a la Fase 2 (plan P01-PG-F2). Las demás facultades continúan en la Fase 1 según D-04.
D-10	01/10/2026	**Habilitación de Módulo de Actas Digitales** En el SIGPRO se incorporó una nueva sección llamada Actas de Reunión donde se muestra el registro oficial de las actas firmadas por la Oficina General de Planificación (OGPL). Cada reunión queda documentada, firmada y publicada en PDF, con enlace directo desde el cronograma.

3. Enunciado del alcance

La Fase 1 comprende la identificación y documentación de los procesos de las 20 facultades de la UNMSM y la elaboración y aprobación del MAGPROF de las facultades que concluyan en el plazo. El Mapa de Procesos Estándar define los procesos de nivel 0; la determinación de los niveles 1 y 2 y de sus productos corresponde al responsable de la gestión por procesos de cada facultad. La fase incluye además el registro de los Anexos 1 y 3, las fichas de indicadores consignadas por la Oficina de Racionalización, la orientación técnica a responsables y dueños de proceso, y el desarrollo inicial del SIGPRO en modo consulta.

Dentro del alcance	Fuera del alcance
Elaboración del MAGPROF en las 20 facultades.	Rediseño de la estructura orgánica de la universidad.
Identificación de procesos estándar de nivel 0 (estratégicos, misionales y de soporte).	Identificación y mapeo de procesos de los órganos de Alta Dirección.
Consolidación del Mapa de Procesos Estándar.	Procesos de entidades externas vinculadas a la UNMSM.
Orientación técnica a responsables de la gestión por procesos y dueños de proceso.	Certificación externa de calidad (ISO u otra) y modificación de la normativa nacional.
Registro de los Anexos 1 y 3 por cada facultad (el Anexo 2 está derogado, D-01).	Documentación de procesos de dependencias centrales ajenas a las facultades (D-02).
Determinación de los indicadores estándar por proceso, a cargo de la Oficina de Racionalización.	Estandarización de subprocesos y productos.
SIGPRO en modo consulta: arquitectura front-end y back-end y módulo de Documentación (D-03).	Automatización de los procesos y procedimientos de las facultades.
Validación y aprobación del MAGPROF según la ruta institucional (D-07).	Diagramación de procedimientos, MAPRO y SIGPRO completo (plan de la Fase 2); evaluación de indicadores (Fase 3); mejora continua (Fase 4).

4. Estructura de desglose del trabajo (EDT / WBS)

La EDT es un artefacto de línea base del dominio de Planificación. Descompone el alcance de la fase en entregables y conserva **los mismos códigos del cronograma de P01** (Etapa › Actividad › Tarea), para que cada tarea del cronograma tenga trazabilidad directa hasta su paquete de trabajo. Se agrega el componente 1.0, de gestión de la fase, que es transversal y no figura en el cronograma.

Estructura de desglose del trabajo (EDT) · Fase 1

Orientada a entregables · códigos idénticos al cronograma de P01 (Etapa › Actividad › Tarea)

1. Fase 1: Identificación y documentación de procesos
MAGPROF de las 20 facultades · Mapa Estándar · Anexos 1 y 3 · Indicadores · SIGPRO en modo consulta

1.0 Gestión de la fase (transversal)
- 1.0.1 Plan de gestión de la Fase 1 aprobado
- 1.0.2 Registros de decisiones, cambios y riesgos
- 1.0.3 Dashboard de avance por facultad — D-05
- 1.0.4 Informe de cierre y paso a la Fase 2 — Compuerta G1 · D-04

1.1 Inicio
- 1.1.1 Matriz de análisis de la Norma Técnica N.º 002-2025-PCM-SGP

1.2 Sensibilización
- 1.2.1 Material de difusión de la gestión por procesos
- 1.2.2 Presentación de continuidad de la gestión por procesos
- 1.2.3 Orientación técnica a responsables y dueños de proceso

1.3 Identificación de procesos
- 1.3.1 Material de la Guía de Gestión por Procesos
- 1.3.2 Mapa de Procesos Estándar para facultades — 16 procesos de nivel 0 · D-06
- 1.3.3 Guía de Gestión por Procesos aprobada y emitida

1.4 Elaboración del MAGPROF
- 1.4.1 Fichas estandarizadas: Anexo 1 y Anexo 3 — Anexo 2 derogado · D-01
- 1.4.2 Indicadores estándar de los procesos
- 1.4.3 Anexos 1 y 3 registrados por facultad
- 1.4.4 SIGPRO en modo consulta (front-end y back-end) — D-03
- 1.4.5 MAGPROF validados, aprobados y cierre de fase — Ruta de aprobación · D-07

Turquesa: entregables del producto · Azul marino: dirección de la fase. La diagramación de procedimientos, el MAPRO y el SIGPRO completo pertenecen al plan de la Fase 2.

Figura 1. Estructura de desglose del trabajo de la Fase 1.

4.1 Diccionario de la EDT

Código	Entregable	Descripción y criterio de terminado	Responsable · decisión
1.0	Gestión de la fase	Plan de gestión aprobado, registros de decisiones, cambios y riesgos, Dashboard al día e informe de cierre de la compuerta G1.	Analista Líder/Senior · D-04, D-05
1.1.1	Matriz de análisis de la Norma Técnica N.º 002-2025-PCM-SGP	Matriz que relaciona cada exigencia de la norma con el entregable del proyecto que la atiende.	Equipo de racionalización
1.2.1 – 1.2.3	Sensibilización y orientación técnica	Material de difusión, presentación de continuidad y orientación técnica a responsables de gestión por procesos y dueños de proceso de las 20 facultades.	Equipo de racionalización
1.3.1 – 1.3.3	Guía y Mapa de Procesos Estándar	Guía de Gestión por Procesos aprobada y emitida; Mapa Estándar con el catálogo único de 16 procesos de nivel 0.	Jefe de la OGPL (aprueba) · D-06
1.4.1	Fichas estandarizadas	Formatos del Anexo 1 y del Anexo 3 con sus directrices de llenado.	Analista Líder/Senior · D-01
1.4.2	Indicadores estándar	Ficha de indicador para cada proceso del Mapa Estándar.	Analista Líder/Senior
1.4.3	Anexos 1 y 3 registrados por facultad	100 % de los productos y procesos de la facultad registrados conforme a las directrices y a la codificación D-08.	Responsable de GxP de la facultad
1.4.4	SIGPRO en modo consulta	Arquitectura front-end y back-end y módulo de Documentación con acceso público (CA-06).	Desarrollador full-stack; especifica el Analista Líder/Senior · D-03
1.4.5	MAGPROF validados, aprobados y cierre de fase	MAGPROF con opinión técnica favorable, Resolución Decanal y ratificación de la DGA; cierre de la fase por facultad.	Decano y DGA · D-07

5. Matriz de trazabilidad de requisitos

La matriz une cada requisito con su origen, el entregable que lo satisface y la forma de verificarlo. Los requisitos de la versión 2.0 que correspondían a otras fases (MAPRO publicado, SIGPRO con todos los módulos y reporte automático de indicadores) se trasladaron a los planes de las Fases 2 y 3.

ID	Requisito	Origen	Entregable (EDT)	Cómo se verifica	Prioridad
RQ-01	Nombres de procesos estratégicos, misionales y de soporte definidos.	NT 002-2025-PCM-SGP	1.3.2	Conformidad con la norma en la matriz 1.1.1	Alta
RQ-02	Mapa de Procesos Estándar con el catálogo único de 16 procesos de nivel 0.	D-06; OGPL	1.3.2	Mapa aprobado y publicado en SIGPRO	Alta
RQ-03	Anexo 1 (inventario de productos y procesos) registrado por cada facultad.	NT; D-01	1.4.3	Revisión contra las directrices de llenado del Anexo 1	Alta
RQ-04	Anexo 3 (ficha de caracterización) registrado por cada facultad.	NT; D-01	1.4.3	Revisión contra las directrices de llenado del Anexo 3	Alta
RQ-05	Ficha de indicador estándar para cada proceso.	NT	1.4.2	Una ficha por proceso del Mapa Estándar	Alta
RQ-06	Procesos de soporte codificados con la correlación única PS.01 a PS.10.	D-08	1.4.3	Cotejo de códigos; un código vacante no se reutiliza	Alta

ID	Requisito	Origen	Entregable (EDT)	Cómo se verifica	Prioridad
RQ-07	El Anexo 2 no se registra en ninguna facultad.	D-01	1.4.1	Ninguna entrega trae Anexo 2	Media
RQ-08	MAGPROF aprobado por la ruta institucional de cuatro niveles.	D-07	1.4.5	Opinión técnica, Resolución Decanal y Resolución Directoral	Alta
RQ-09	SIGPRO disponible en modo consulta con los documentos de gestión publicados.	D-03	1.4.4	Revisión del módulo de Documentación (CA-06)	Media
RQ-10	El avance de la fase se mide en el Dashboard de SIGPRO.	D-05	1.0	El Dashboard refleja el avance por facultad	Media
RQ-11	Solo pasan a la Fase 2 las facultades con el 100 % de los Anexos 1 y 3.	D-04	1.0	Compuerta G1 por facultad (Anexo B.3)	Alta

6. Criterios de aceptación

Se define de antemano cuándo un entregable está terminado y quién lo acepta (dominio de Entrega). Se aceptan tres niveles: los anexos de cada facultad, el MAGPROF y el cierre de la fase por facultad (compuerta G1). No hay aceptación parcial: un criterio incumplido devuelve el entregable.

ID	Criterio	Umbral	Cómo se comprueba	Quién acepta
CA-01	Anexo 1 conforme	100 % de los registros según las directrices y reglas obligatorias de llenado	Revisión de la Oficina de Racionalización	Analista Líder/Senior
CA-02	Anexo 3 conforme	100 % de las fichas según las directrices y reglas oficiales de llenado	Revisión de la Oficina de Racionalización	Analista Líder/Senior
CA-03	Codificación	100 % de los procesos con código del catálogo único (D-06 y D-08)	Cotejo contra el Mapa Estándar	Equipo de racionalización
CA-04	Indicadores	Una ficha de indicador por proceso del Mapa Estándar	Revisión de las fichas	Analista Líder/Senior
CA-05	MAGPROF de la facultad	Opinión técnica favorable, Resolución Decanal y ratificación por Resolución Directoral	Expediente según la ruta D-07	Decano (aprueba) y DGA (ratifica)
CA-06	SIGPRO en modo consulta	Módulo «Documentación de la Gestión de Procesos» con acceso público: Plan de gestión, Cronograma, Formatos y Anexos, Normativas y Guías, Dashboard y Equipo de trabajo	Revisión funcional del módulo	Jefe de la OGPL
CA-07	Cierre de la fase por facultad (G1)	Avance de la facultad = 100 % (0,5 × Anexo 1 + 0,5 × Anexo 3)	Dashboard de SIGPRO	Jefe de la OGPL

Observación grave: impide usar el registro (proceso sin código del catálogo, producto sin proceso vinculado, ficha sin responsable). **Observación leve:** no impide usarlo (redacción, formato de fecha, campo opcional vacío).

7. Roles y responsabilidades (RACI)

Corresponde al dominio de desempeño del Equipo. La matriz asegura la fluidez operativa entre las facultades (decanos y responsables de gestión por procesos) y los órganos centrales (Oficina de Racionalización, OGPL y DGA), de modo que toda documentación técnica cuente con el respaldo de la autoridad competente antes de su publicación.

ENTREGABLE O ACTIVIDAD	JEFE OGPL	ANALISTA LÍDER/SENIOR	ANALISTAS DE RACIONALIZACIÓN	DECANO / CONSEJO	RESPONSABLE GXP DE FACULTAD	DGA	DESARROLLADOR FULL-STACK
1.1.1 Matriz de análisis de la norma	I	A	R	–	–	–	–
1.2 Capacitación y orientación técnica	A*	A	R	I	I	–	–
1.3.2 Mapa de Procesos Estándar	A*	A	R	C	C	I	–
1.3.3 Guía de Gestión por Procesos	A*	A	R	I	I	I	–
1.4.1 y 1.4.2 Fichas e indicadores estándar	I	A	R	–	C	–	–
1.4.3 Elaborar el MAGPROF (Anexos 1 y 3)	I	C	C	A	R	–	–
1.4.5 Validar la documentación (opinión técnica)	I	A	R	I	I	I	–
1.4.5 Aprobar el MAGPROF (Resolución Decanal)	I	C	I	A	I	I	–
1.4.5 Ratificar el MAGPROF (Resolución Directoral)	I	C	I	I	I	A	–
1.4.4 SIGPRO en modo consulta	I	A	C	–	–	–	R
1.0 Evaluar el avance y la compuerta G1	A*	R	R	I	I	I	–
Control de cambios (sección 8)	A*	A	R	C	R	–	–

R: lo hace · A: aprueba técnicamente y responde por el resultado · A*: aprobación final del Jefe de la OGPL, solo en los entregables y cambios de su umbral (sección 8) · C: se le consulta antes · I: se le informa después · –: no participa. El SIGPRO lo ejecuta el desarrollador full-stack, con especificaciones del Analista Líder/Senior.

7.1 Asignación del equipo

ROL	PERSONA	ÁMBITO EN LA FASE 1
Analista Líder/Senior	Alvaro Rojas	Metodología, indicadores, revisión de anexos y conducción del equipo
Analista Técnico en Relevamiento de Procesos	Isabel Flores	Acompañamiento de campo a las facultades

ROL	PERSONA	ÁMBITO EN LA FASE 1
Analista Operativo en Documentación y Seguimiento	Oriol Romero	Repositorio, registros y Dashboard
Desarrollador full-stack (SIGPRO)	Luis Balarezo	Front-end, back-end y módulo de Documentación
Responsables de GxP de las facultades	Jefes de Unidad de planificación , Presupuesto y Racionalización	Registro de los Anexos 1 y 3 y expediente del MAGPROF

7.2 Funciones del equipo de trabajo

Alvaro Rojas Carnero
Analista Líder/Senior · Oficina de Racionalización – OGPL Conducir el diseño arquitectónico de los procesos institucionales mediante el mapeo, el modelamiento bajo el estándar BPMN 2.0 y el desarrollo de fichas de caracterización e indicadores. Asimismo, brindar acompañamiento técnico-metodológico para asegurar la correcta implementación del enfoque de gestión por procesos en la organización.

Actividades:
Diseñar, estandarizar y actualizar el marco metodológico de la gestión por procesos (Plan de Gestión, Guía Práctica N.º 001, fichas de caracterización, diseño de indicadores y otros documentos), garantizando su alineamiento con los objetivos institucionales.
Asesorar y brindar acompañamiento técnico especializado de manera continua a los responsables de procesos en las 20 facultades de la UNMSM, facilitando la transferencia de conocimientos y la correcta adopción del modelo.
Conducir y auditar la diagramación de flujos de procesos bajo el estándar BPMN 2.0 (empleando herramientas como Bizagi Modeler), validando rigurosamente la coherencia de entradas, salidas, controles, normativas y responsables del Mapa Estándar.
Liderar, coordinar y controlar el desempeño y las actividades operativas del equipo de trabajo, asegurando la calidad técnica de los entregables y el cumplimiento del cronograma.
Definir y coordinar estratégicamente con el equipo de desarrollo y programación las especificaciones funcionales, reglas de negocio y arquitecturas de flujo que debe reflejar el Sistema de Gestión por Procesos, identificando además oportunidades de integración y automatización (RPA).
Consolidar el análisis de datos sobre los avances porcentuales, gestionar el levantamiento de observaciones técnicas y reportar mensualmente el progreso a la Jefatura de la OGPL mediante dashboards dinámicos y reportes ejecutivos.

- **Entregables:**
- Planes de Gestión del Proyecto
- Mapa de Procesos Estándar Institucional
- Guías y Lineamientos Técnicos
- Procedimientos Estándar Optimizados (TO-BE)
- Reportes de Auditoría de Modelado (BPMN 2.0)
- Registros de Control del Proyecto
- Casos de Uso para Automatización
- Informes de Cierre de Fase y Lecciones Aprendidas

Isabel Flores Huamaní
Analista Jr. Técnico en Relevamiento de Procesos · Oficina de Racionalización – OGPL
Ejecutar el trabajo de campo para el modelado de procesos y brindar soporte tecnológico a las facultades, impulsando la transformación digital operativa mediante la automatización de flujos documentales y la creación de tableros de control que garanticen el seguimiento eficiente de la gestión por procesos institucional.

- **Actividades:¨**
- Desarrollar e implementar automatizaciones mediante Google Apps Script para agilizar el registro, control y la gestión general de la documentación, eliminando tareas manuales repetitivas.

- Crear y actualizar de manera periódica dashboards de control interactivos que permitan monitorear de forma continua el porcentaje de avance de los procesos, el cumplimiento de los cronogramas y la recepción oportuna de entregables por parte de las facultades.
- Instruir y asistir técnica y operativamente a los enlaces y dueños de proceso de cada facultad en el correcto llenado metodológico de las Fichas de Caracterización (Anexo 3: proveedores, entradas, actividades, salidas y controles).
- Brindar soporte en la capacitación y adopción de las nuevas herramientas digitales y sistemas (p. ej., SIGPRO) desplegados por la analista senior . Levantamiento y Modelado de Procesos (AS-IS):Ejecutar entrevistas y mesas de trabajo en campo con los jefes de las unidades orgánicas para recopilar la secuencia operativa de los procedimientos (series PE, PM y PS).
- Diagramar los flujogramas utilizando notación estandarizada BPMN 2.0 (Bizagi Modeler / MS Visio), documentando de manera exacta los 7 campos normativos (tareas, responsables, compuertas lógicas, etc.).
- Presentar los diagramas elaborados a las unidades correspondientes, levantando observaciones hasta obtener la firma de las Actas de Conformidad.
- Cargar los procedimientos validados y sus actas en el repositorio digital del sistema para su consolidación en los Manuales de Procedimientos.

Entregables:
Procedimientos As-Is (texto y diagrama) de la facultad asignada
Actas de visita
Actas de conformidad preparadas para firma.
Automatizaciones el entorno de Google Apps Script

Oriol Romero Saavedra
Analista Jr. Operativo de Documentación y Control · Oficina de Racionalización – OGPL
Diseñar, estructurar y monitorear el sistema de medición del desempeño de la organización. Garantizado que los procesos estandarizados cuenten con métricas precisas, lógicas de cálculo robustas y visibilidad en tiempo real para facilitar la toma de decisiones basada en datos y la prevención de riesgos operativos.

- **Actividades:¨**
- Realizar entrevistas con los dueños de los procesos y mapear los flujos de trabajo en estado actual (AS-IS) y futuro (TO-BE) utilizando notación BPMN 2.0 (mediante herramientas como Bizagi Modeler o MS Visio).
- Definir, documentar y parametrizar las fichas de indicadores (KPIs) correspondientes a los procesos del Mapa Estándar de la organización.
- Estructurar los metadatos y establecer criterios de medición rigurosos, asegurando su perfecta alineación con la arquitectura de procesos.
- Organizar, codificar y establecer la lógica de cálculo precisa para cada indicador de gestión.
- Validar rigurosamente la integridad de las fuentes de información y asegurar la viabilidad técnica para la recolección sistemática de los datos.
- Actualizar de forma periódica en el dashboard el porcentaje de avance correspondiente al Anexo 4 (Indicadores), asegurando la visualización dinámica de los KPIs para el monitoreo integral del desempeño.
- Generar y reportar alertas tempranas frente a retrasos o contingencias mediante la detección de cuellos de botella, facilitando la toma de acciones preventivas por parte de la Subgerencia para mitigar riesgos operativos de manera oportuna.

Entregables:
Cronograma actualizado
Reportado semanalmente.
Registro de Indicadores debidamente documentado, parametrizado y aprobado.
Matriz de seguimiento
Control de entregables correspondientes a las 20 facultades.

8. Control de cambios

El control de cambios define el procedimiento para modificar los entregables de la fase (Mapa Estándar, anexos, indicadores, MAGPROF y SIGPRO en modo consulta). Toda solicitud fuera del alcance del proyecto (estructura orgánica, normativa ISO o normativa nacional) se rechaza en la evaluación técnica.

8.1 Umbrales de autoridad

Tipo de cambio	Quién resuelve	Plazo de respuesta
Corrección de forma en un entregable ya aceptado	Analista asignado	En el acto
Ajuste de un anexo o indicador que no cambia el catálogo ni la codificación	Equipo de racionalización (Analista Líder/Senior)	3 días hábiles
Movimiento de un hito dentro de la fase	Equipo de racionalización (Analista Líder/Senior)	3 días hábiles
Cambio del Mapa Estándar, del catálogo, de la codificación, de la fecha de la compuerta G1 o de una decisión D-0x	Jefe de la OGPL	5 días hábiles

8.2 Flujo

Paso	Acción	Descripción	Responsable
1	Registro de la solicitud	Documento por SGD con la necesidad de modificar un requisito o entregable, justificando la causa; se envía antes del cierre de la fase respectiva.	Responsable de GxP de la facultad o quien detecta la necesidad
2	Análisis del impacto	Viabilidad técnica y normativa (alineación con la NT 002-2025-PCM-SGP) e impacto en la ruta crítica, verificando que no impida culminar el 100 % de la fase en curso.	Equipo de racionalización (Analista Líder/Senior)
3	Decisión	Aprobar, rechazar o diferir la solicitud según el umbral de 8.1.	Autoridad del umbral
4	Actualización de la documentación	Línea base del alcance (enunciado y EDT) y documentos afectados (Mapa Estándar, fichas, indicadores o backlog del SIGPRO).	Equipo de racionalización
5	Comunicación	Actualización del repositorio del Centro de la Documentación de la Gestión por Procesos (CDGP) en SIGPRO y notificación formal a los dueños de proceso.	Analista operativo

Directrices.

- **Bloqueo por cambio de fase:** ningún cambio al alcance de la Fase 1 se evalúa si la facultad ya transitó a la Fase 2; así la línea base aprobada para la diagramación de procedimientos no cambia.
- **Trazabilidad única:** todo cambio aprobado se refleja a la vez en los documentos normativos (MAGPROF) y en el SIGPRO, para mantener una sola fuente de verdad.
- **Evaluación de riesgos:** en el paso 2 se identifica si el cambio pone en riesgo los hitos límite del proyecto (30/09/2026, 30/04/2027 y 30/06/2027).

Registro. Una fila por solicitud: código, fecha, solicitante, descripción, efecto estimado en días, decisión, fecha de decisión y entregables actualizados.

9. Gestión del cronograma

El enfoque es **predictivo por etapas**: la fase avanza Inicio › Sensibilización › Identificación de procesos › Elaboración del MAGPROF, y se cierra por facultad en la compuerta G1. El cronograma de P01 en el sistema Gestión es la línea base y sigue estos parámetros:

1. **Codificación jerárquica:** cada elemento tiene un código único por niveles de desglose (por ejemplo, T1.1.1.01); el prefijo «T» identifica tareas y «H» hitos.
2. **Atributos de actividad:** toda tarea registra etapa y actividad, descripción, responsable, duración en días hábiles y fechas de inicio y fin (dd/mm/aaaa).
3. **Lógica de red y ruta crítica:** toda tarea declara al menos una predecesora y su tipo de vínculo (por ejemplo, FC: fin a comienzo). No se admiten tareas sin dependencias.
4. **Monitoreo del estado:** el avance se supervisa con el campo «Estado»; cualquier paralización u holgura no planificada se registra como incidencia.
5. **Hitos:** todo elemento de duración cero es un hito de control y nunca una tarea de esfuerzo.

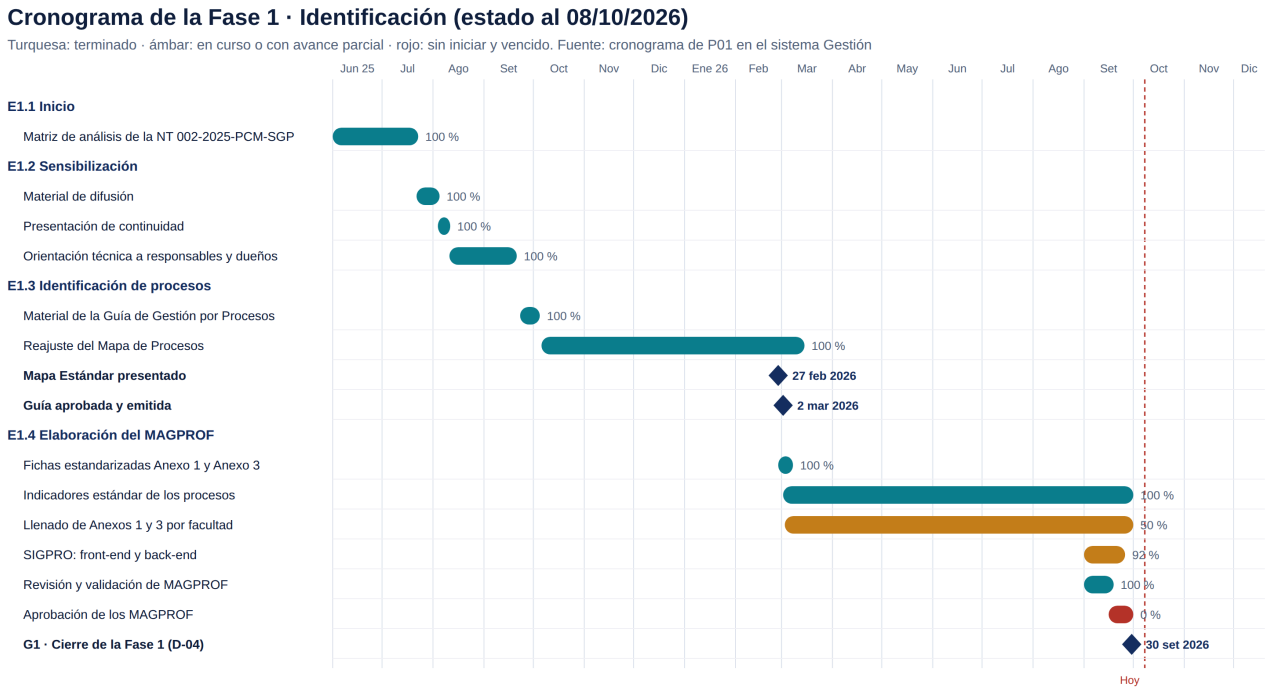


Figura 2. Cronograma de la Fase 1 y su estado al 08/10/2026.

9.1 Hitos

Hito	Descripción	Fecha	Estado al 08/10/2026	Estado
H1	Matriz de análisis de la Norma Técnica terminada	22/07/2025	Cumplido	✓ **Cumplida 2025-07-22**
H2	Orientación técnica a responsables y dueños de proceso	20/09/2025	Cumplido	✓ **Cumplida 2025-09-20**
H3	Mapa de Procesos Estándar presentado a las facultades	27/02/2026	Cumplido	✓ **Cumplida 2026-02-27**
H4	Guía de Gestión por Procesos aprobada y emitida	02/03/2026	Cumplido	✓ **Cumplida 2026-03-02**
H5	Fichas del Anexo 1 y del Anexo 3 estandarizadas	07/03/2026	Cumplido	✓ **Cumplida 2026-03-07**
H6	Indicadores estándar de los procesos determinados	30/09/2026	Cumplido	✓ **Cumplida 2026-09-30**
H7	SIGPRO en modo consulta (front-end y back-end)	25/09/2026	En curso (92 %)	✓ **Cumplida 2026-10-07**
H8	MAGPROF aprobados	30/09/2026	Vencido (0 %)	Pendiente

Hito	Descripción	Fecha	Estado al 08/10/2026	Estado
G1	Compuerta de cierre de la Fase 1, por facultad	30/09/2026	Cruzada por FDCP, FPSIC, FIEE y FCA (D-09); el registro de anexos del conjunto va al 50 %	✓ **Cumplida 2026-10-07**

9.2 Supuestos y restricciones

- **Restricción:** la compuerta G1 vence el 30/09/2026 (D-04). Las facultades que no cumplen permanecen en la Fase 1 sin nueva fecha general; cada una cierra cuando completa sus anexos.
- **Supuesto:** los responsables de GxP disponen de tiempo para registrar los anexos de su facultad.
- **Dependencia externa:** la aprobación del MAGPROF depende del Consejo de Facultad y de la ratificación de la DGA (D-07), fuera del control del equipo.
- **Dependencia externa:** el SIGPRO en modo consulta depende de un único desarrollador (riesgo R-04).

9.3 Control del avance

El avance oficial se calcula por facultad (sección 10) y se publica solo en el Dashboard de SIGPRO (D-05). Una desviación de más de 5 días hábiles sobre un hito se trata como solicitud de cambio (sección 8). El cronograma completo y actualizado está en el cronograma de P01 del sistema Gestión y en SIGPRO.

10. Gestión de la calidad

La calidad se asegura con indicadores clave que miden de forma objetiva, trazable y estandarizada el progreso de las 20 facultades, porque de ellos depende la transición de fase . Los mismos indicadores alimentan el Dashboard.

#	MÉTRICA Y FÓRMULA	UMBRAL	CUÁNDO SE MIDE	SI NO SE CUMPLE
Q-01	Avance oficial de la Fase 1: promedio del avance de las 20 facultades ([% FM] + [% FDCP] + … + [% FISI]) / 20	100 % al cierre del proyecto	Semanal	Se prioriza el acompañamiento a las facultades con menor avance
Q-02	Avance de la Fase 1 por facultad: (% Anexo 1 × 0,5) + (% Anexo 3 × 0,5)	100 % para cruzar G1	Semanal	La facultad permanece en la Fase 1 (D-04) y recibe observaciones con plazo
Q-03	Ejecución de tareas de la Fase 1: tareas ejecutadas ÷ total de tareas de la Fase 1	Igual o mayor que lo planificado a la fecha	Quincenal	Se revisa la ruta crítica y se registra la incidencia
Q-04	Ejecución de tareas del proyecto: tareas ejecutadas ÷ total de tareas de las Fases 1, 2 y 3	Igual o mayor que lo planificado a la fecha	Mensual	Se informa al Jefe de la OGPL en el reporte mensual

Reglas de revisión. Los anexos se revisan contra las directrices y reglas de llenado del Anexo 1 y del Anexo 3. El Analista revisor no corrige: devuelve con las observaciones identificadas por SIGRO

11. Gestión de riesgos

Corresponde al dominio de Incertidumbre. Se usa la misma escala que en todos los planes de fase: probabilidad × impacto de 1 a 5 (alta ≥ 15, media 8 a 14, baja ≤ 7) y las estrategias del PMBOK 7 (escalar, evitar, transferir, mitigar o aceptar; para oportunidades, escalar, explotar, compartir, mejorar o aceptar). Se identificaron nueve riesgos en las categorías de facultad, recursos, contratos, calidad, decisión y cronograma; varios ya se materializaron y se gestionan como incidentes.

ID	RIESGO	P	I	EXP.	ESTRATEGIA	RESPUESTA	PROPIETARIO
R-01	Las facultades no remiten la documentación en plazo (solo 6 de 20 remitieron la diagramación de PE.02) · Facultad	4	4	16	Mitigar	Oficio con plazo y seguimiento semanal en el Dashboard; a la segunda omisión, reunión con el decano; D-04 mantiene a la facultad en la Fase 1	Responsable de GxP de la facultad
R-02	Los órganos consultados no emiten retroalimentación (solo 3 facultades enviaron la encuesta / modelo CONEAU; el VRAP no remitió) · Facultad	4	3	12	Escalar	El Jefe de la OGPL formaliza el requerimiento con fecha límite al VRAP y a las OCAA	OCAA de la facultad y VRAP
R-03	La OCAA no aprueba los procedimientos de PE.02 por falta del listado de evidencias CONEAU 2025 (bloqueado desde el 30/04/2026) · Facultad	4	4	16	Escalar	Materializado: se gestiona como incidente; el Jefe de la OGPL solicita el listado y se documenta PE.02 con las evidencias vigentes	OCAA
R-04	Dependencia de una sola persona para el desarrollo del SIGPRO (29 subtareas asignadas a una sola persona) · Recursos	4	5	20	Mitigar	Repositorio de código y documentación técnica al día; el programador contratado el 26/08/2026 trabaja en pareja para cubrir ausencias	Jefe de la OGPL
R-05	Retraso en la contratación del programador a cargo de OGPL / Quipucamayoc (acordada el 01/07/2026, efectiva el 26/08/2026) · Contratos	4	4	16	Aceptar	Materializado y cerrado: se registra como lección aprendida para las contrataciones de las Fases 2 y 3	OGPL / Quipucamayoc
R-06	No se concretó la contratación del bolsista de la OCAA para procesar la encuesta / CONEAU (acordada el 01/07/2026, sin concretar al 09/09/2026) · Contratos	4	4	16	Escalar	Materializado: el Jefe de la OGPL lo eleva a la OCAA; mientras tanto, el analista operativo procesa la encuesta con una plantilla automatizada	OCAA
R-07	Datos contaminados entre facultades por uso de formularios ajenos (FCF usa el sufijo _F02 de FDCP) · Calidad	3	4	12	Mitigar	Plantillas por facultad con sufijo fijo y validación del sufijo al cargar en SIGPRO	Responsable de GxP de la facultad y dueño del proceso
R-08	Dos numeraciones de procesos de soporte en circulación (PS.04 a PS.10 desplazados por el código PS.08) · Decisión	4	5	20	Evitar	Aplicar D-08: correlación única PS.01 a PS.10 y recodificación en una sola pasada	Responsable de GxP de la facultad
R-09	La ruta crítica no admite retrasos: 15 días hábiles desde el 09/09/2026 (T1.3.3.02 → T1.3.5.01 → T1.3.5.02 → H1.3.5.03) · Cronograma	4	5	20	Aceptar (activa)	Materializado: la aprobación de los MAGPROF quedó en 0 % al 30/09/2026; cada facultad cierra al completar sus anexos (D-04) y se prioriza el trámite D-07	Jefe de la OGPL
O-01	Oportunidad: la conexión de Google Sheets con SIGPRO (D-01) elimina el registro manual y acelera la revisión	4	3	12	Explotar	Extender la conexión a los indicadores para alimentar el Dashboard sin carga manual	Analista Líder/Senior

12. Interesados y comunicaciones

Estrategia de comunicación y de gestión de expectativas para los interesados clave de las 20 facultades. Se usan los mismos cinco niveles de compromiso que en todos los planes de fase: desconocedor, reticente, neutral, partidario y líder; A es el nivel estimado actual y D el deseado.

Interesado	Interés principal	Influencia	Compromiso A → D	Estrategia de involucramiento
Dirección General de Administración	Monitorear el avance de los indicadores de las facultades	Alta	Neutral → Partidario	Reporte de avance con las cifras del Dashboard; ratificación oportuna de los MAGPROF
Jefe de la OGPL	Cumplir la Norma Técnica SGP y monitorear los indicadores	Alta	Partidario → Líder	Reunión semanal de seguimiento de la ruta crítica
Decanos	Aprobar el MAGPROF y verificar el avance de su facultad	Alta	Neutral → Partidario	Oficio con observaciones y plazo; reunión con la facultad
Responsables de GxP de la facultad	Que su documentación sea revisada y aceptada	Media	Neutral → Partidario	Correo con observaciones tras cada revisión de levantamiento
OCAA	Alinear la documentación con el modelo de acreditación CONEAU 2025	Media	Reticente → Partidario	Reuniones de validación de procedimientos y requerimientos con fecha límite
Jefes de unidades orgánicas	Instrucciones claras y estables sobre qué anexos llenar	Media	Neutral → Partidario	Remisión de sus productos, procesos e indicadores observados
Quipucamayoc	Integrar el SIGPRO con los sistemas institucionales	Baja	Neutral → Partidario	Coordinación para la incorporación de la seguridad del sistema

12.1 Matriz de comunicaciones

Por D-05, el avance se consulta en el Dashboard de SIGPRO: las reuniones y los reportes usan el Dashboard como fuente.

Qué se comunica	A quién	Frecuencia	Medio	Responsable
Ruta crítica, riesgos altos y cambios	Jefe de la OGPL	Semanal	Dashboard y reunión de seguimiento	Analista Líder/Senior
Avance de los indicadores por facultad	Dirección General de Administración	Mensual	Reporte ejecutivo con el Dashboard	Analista Líder/Senior
Observaciones y plazo de levantamiento	Decano y responsable de GxP	Tras cada revisión	Oficio por SGD y correo	Analista asignado
Validación de procedimientos con evidencias	OCAA	Según el calendario de validación	Reunión con acta	Analista Líder/Senior
Resultado de la compuerta G1	Decanos y Jefe de la OGPL	Al cerrar cada facultad	Oficio e informe de cierre	Analista Líder/Senior

Escalamiento. Un bloqueo que no se resuelve en 3 días hábiles sube al Analista Líder/Senior; si pasa de 5, al Jefe de la OGPL; si involucra a una facultad, se informa al decano.

13. Documentos que integran este plan

Relación de documentos y anexos de la fase, que proveen la fuente única de información aprobada. Este plan prevalece sobre los demás documentos de la fase: si alguno lo contradice, manda el plan hasta que el cambio pase por la sección 8.

#	DOCUMENTO	CATEGORÍA PMBOK 7	PARA QUÉ SIRVE	QUIÉN LO MANTIENE
1	Plan de gestión de la Fase 1 (este documento, v3.0)	Plan	Fija cómo se ejecuta y controla la fase	Analista Líder/Senior

#	DOCUMENTO	CATEGORÍA PMBOK 7	PARA QUÉ SIRVE	QUIÉN LO MANTIENE
2	Plan de gestión del cronograma v2.0	Línea base y datos visuales	Fechas, dependencias, responsables, hitos y ruta crítica	Analista Líder/Senior
3	Formatos y Anexos v1.0 (Anexo 1: inventario; Anexo 3: fichas; Anexo 4: indicadores)	Estrategia (estándar)	Que todas las facultades registren con el mismo formato	Analista Líder/Senior
4	Normativas y Guía v1.0 (Guía Práctica de Implementación de la Gestión por Procesos)	Estrategia	Marco metodológico de la fase	Analista Líder/Senior
5	Dashboard v1.0 (Panel de Control de Gestión por Procesos)	Datos visuales	Única fuente del avance (D-05)	Analista operativo y desarrollador
6	Registros de decisiones, cambios y riesgos (secciones 2, 8 y 11)	Registro	Qué se decidió, qué cambió y qué puede fallar	Analista operativo
7	Informe de cierre de la compuerta G1 por facultad	Informe	Evidencia del paso a la Fase 2	Analista Líder/Senior y Jefe de la OGPL

Los documentos viven en el repositorio del Centro de la Documentación de la Gestión por Procesos (CDGP) en SIGPRO

Contacto. Oficina de Racionalización · Calle Germán Amézaga N.º 375, Ciudad Universitaria, Lima · Teléfono (01) 619-7000, anexo 7358 · racionalizacion.ogpl@unmsm.edu.pe

14. Cronograma detallado de la Fase 1: Identificación

Tareas de la línea base con sus fechas y su avance según el cronograma de P01 en el sistema Gestión al 08/10/2026.

Código	Tarea	Fechas	Avance	Estado
T1.1.1.1	Matriz de análisis de la documentación de la Norma Técnica N.º 002-2025-PCM-SGP	01/06/2025 – 22/07/2025	100 %	✓ **Cumplida 2025-07-22**
T1.2.1.1	Material de difusión de la gestión por procesos	22/07/2025 – 04/08/2025	100 %	✓ **Cumplida 2025-08-04**
T1.2.2.1	Presentación de la continuidad de la gestión por procesos	04/08/2025 – 09/08/2025	100 %	✓ **Cumplida 2025-08-09**
T1.2.3.1	Orientación técnica a responsables de la gestión por procesos y dueños de proceso	11/08/2025 – 20/09/2025	100 %	✓ **Cumplida 2025-09-20**
T1.3.1.1	Preparación del material para la elaboración de la guía	23/09/2025 – 04/10/2025	100 %	✓ **Cumplida 2025-10-04**
T1.3.2.1	Análisis de la información preexistente (mapa e indicadores)	06/10/2025 – 17/10/2025	100 %	✓ **Cumplida 2025-10-17**
T1.3.2.2	Presentación de los hallazgos del mapa e indicadores	27/10/2025 – 31/10/2025	100 %	✓ **Cumplida 2025-10-31**
T1.3.2.3	Recepción de la retroalimentación del mapa de procesos de las facultades	16/12/2025 – 14/03/2026	100 %	✓ **Cumplida 2026-03-14**
T1.3.2.4	Presentación del Mapa Estandarizado para facultades	27/02/2026	100 %	✓ **Cumplida 2026-02-27**
T1.3.3.1	Aprobación y emisión de la Guía de Gestión por Procesos	02/03/2026	100 %	✓ **Cumplida 2026-03-02**

Código	Tarea	Fechas	Avance	Estado
T1.4.1.1	Fichas ajustadas y estandarizadas de inventario (Anexo 1) y de caracterización (Anexo 3)	27/02/2026 – 07/03/2026	100 %	✓ **Cumplida 2026-03-07**
T1.4.2.1 – T1.4.2.5	Determinación de los indicadores estándar (PE.01 a PE.03, PM.01 a PM.03, PS.01 a PS.09)	02/03/2026 – 30/09/2026	100 %	✓ **Cumplida 2026-09-30**
T1.4.3.1	Llenado de las fichas de productos y procesos (Anexos 1 y 3)	03/03/2026 – 30/09/2026	50 %	Pendiente
T1.4.4.1	Construcción del front-end y back-end del SIGPRO	01/09/2026 – 25/09/2026	92 %	✓ **Cumplida 2026-10-07**
T1.4.5.1	Revisión y validación de los MAGPROF	01/09/2026 – 18/09/2026	100 %	✓ **Cumplida 2026-09-18**
T1.4.5.2	Aprobación de los MAGPROF	16/09/2026 – 30/09/2026	0 %	Pendiente
T1.4.5.3	Cierre de la Fase 1	01/10/2026 – 02/10/2026	0 %	✓ **Cumplida 2026-10-07**

Anexo A. Correspondencia con la Guía del PMBOK 7.ª edición

La 7.ª edición del PMBOK organiza la dirección de proyectos en 12 principios y 8 dominios de desempeño, y trata los documentos como artefactos adaptables. Todos los planes de fase usan la misma correspondencia:

Dominio de desempeño	Dónde se aplica en el plan	Principios relacionados
Interesados	Sección 12	Involucrarse eficazmente con los interesados
Equipo	Sección 7	Equipo colaborativo; liderazgo
Enfoque de desarrollo y ciclo de vida	Sección 9	Adaptar según el contexto (tailoring)
Planificación	Secciones 4, 9 y 14	Pensamiento sistémico; enfocarse en el valor
Trabajo del proyecto	Secciones 8 y 13	Administración responsable (stewardship)
Entrega	Secciones 5 y 6	Enfocarse en el valor; incorporar la calidad
Medición	Secciones 9 y 10	Incorporar la calidad en procesos y entregables
Incertidumbre	Sección 11	Optimizar las respuestas a los riesgos; adaptabilidad y resiliencia; permitir el cambio

Anexo B. Arquitectura de planes y gobernanza del proyecto P01

Este anexo es **idéntico en todos los planes de fase**. Define cómo se relacionan los planes entre sí, qué decide cada instancia y qué debe cumplirse para pasar de una fase a la siguiente. En la Guía del PMBOK 7 corresponde a la gobernanza del proyecto (dominio de Planificación y principio de administración responsable).

B.1 Planes que integran el proyecto

Nivel	Documento	Qué gobierna	Estado al 08/10/2026
Proyecto	Acta de constitución y cronograma maestro de P01	Objetivo, fases, hitos de compuerta y presupuesto. Prevalece sobre los planes de fase.	Vigente (sistema Gestión y SIGPRO)
Fase 1 · Identificación	P01-PG-F1	MAGPROF de las 20 facultades, Mapa Estándar, Anexos 1 y 3, indicadores estándar y SIGPRO en modo consulta.	v3.0 para validación (cierre de fase)
Fase 2 · Implementación	P01-PG-F2	Procedimientos (texto y diagrama BPMN 2.0), To-Be estándar, actas de conformidad y carga en SIGPRO, por grupos de facultades.	v1.1 · secciones 1 a 3 validadas
Fase 3 · Evaluación	P01-PG-F3	Medición de indicadores, auditoría interna e informe de evaluación de indicadores críticos y no registrados.	Por elaborar antes de la compuerta G2
Fase 4 · Mejora	P01-PG-F4	Mejora continua a partir del informe de evaluación. Plan independiente: el alcance del proyecto no incluye la Fase 4.	Por elaborar antes de la compuerta G3

B.2 Reglas comunes a todos los planes

1. **Misma estructura.** Las 14 secciones, el Anexo A y este Anexo B se mantienen en todos los planes, aunque una sección quede breve. Así cualquier persona encuentra lo mismo en el mismo lugar.
2. **Jerarquía.** Un plan de fase no contradice al acta ni al cronograma maestro del proyecto. Si lo hace, prevalece el nivel superior hasta que el cambio se apruebe (sección 8).
3. **Códigos con prefijo de fase.** Fuera de su propio plan, las decisiones, requisitos y elementos de la EDT se citan con el prefijo de su fase (por ejemplo, F1-D-04 o F2-1.2.3), porque cada plan numera desde 1.
4. **Una sola fuente de avance.** El avance de todas las fases se publica en el Dashboard / Tablero de SIGPRO; no se elaboran reportes paralelos.
5. **Versiones.** Cada plan tiene un código P01-PG-Fn. La versión sube de número entero al aprobarse y de decimal al corregirse; cada versión registra en su sección 2 las decisiones nuevas con su fecha.
6. **Dónde vive cada plan.** El Word editable en la carpeta del proyecto P01 en Drive (01 Planificación); la versión vigente en el módulo de Documentación de SIGPRO; y su estado, en la pestaña Gobernanza del sistema Gestión.

B.3 Compuertas entre fases

Por la decisión F1-D-04, ninguna facultad pasa a la fase siguiente sin completar al 100 % la fase previa. Las compuertas se evalúan **por facultad**: cada facultad cruza su compuerta cuando cumple, sin esperar a las demás.

Compuerta	Entre	Criterio de paso	Evidencia	Decide
G1	Fase 1 → Fase 2	100 % de los Anexos 1 y 3 registrados (avance por facultad = 0,5 × Anexo 1 + 0,5 × Anexo 3) y MAGPROF validado.	Dashboard de SIGPRO y expediente del MAGPROF	Jefe de la OGPL
G2	Fase 2 → Fase 3	100 % de los procedimientos con acta de conformidad y cargados en SIGPRO; MAPRO aprobado.	Tablero de SIGPRO y resolución del MAPRO	Jefe de la OGPL
G3	Fase 3 → Fase 4	Informe de evaluación de indicadores aprobado, con brechas y desviaciones identificadas.	Informe de evaluación	Jefe de la OGPL, con conocimiento de la DGA

B.4 Instancias de decisión y escalamiento

Instancia	Decide	Plazo y escalamiento
Jefe de la OGPL	Aprueba los planes, las compuertas, los cambios de alcance de una fase, de un hito de compuerta o de una decisión D-0x.	5 días hábiles
Analista Líder/Senior	Dirige al equipo; aprueba técnicamente los entregables y los cambios dentro de la fase que no mueven hitos de compuerta ni decisiones.	3 días hábiles; si no se resuelve, sube al Jefe de la OGPL
Analistas de racionalización	Resuelven correcciones de forma y proponen cambios con su efecto estimado.	En el acto
Decano y Consejo de Facultad	Aprueban el MAGPROF y el MAPRO de su facultad (Resolución Decanal).	Según la ruta de aprobación F1-D-07
Dirección General de Administración	Ratifica los manuales mediante Resolución Directoral.	Según la ruta de aprobación F1-D-07
Responsable de GxP y dueños de proceso	Registran la documentación de su facultad y dan conformidad a sus procedimientos.	Un bloqueo de facultad se informa al decano

B.5 Brechas de gobernanza identificadas en esta revisión

- **Componentes de la Fase 2 sin plan.** El cronograma de P01 incluye en la Fase 2 el despliegue completo del SIGPRO y la aprobación y publicación de los MAPRO (hasta el 30/04/2027), pero el plan P01-PG-F2 solo cubre el primer despliegue de procedimientos en 4 facultades. Se recomienda incorporarlos en la próxima versión del plan de Fase 2, como nuevos componentes de su EDT.
- **Siguientes grupos de facultades.** Las facultades que cruzan G1 después del 30/09/2026 (F2-D-08) deben entrar como nuevos grupos dentro del mismo plan de Fase 2 (nueva versión), no como planes nuevos.
- **Autoridad sobre los cambios.** Se homologaron los umbrales de la sección 8 en ambos planes: los cambios de hitos de compuerta, de alcance de fase o de decisiones los resuelve el Jefe de la OGPL.
- **Fase 4.** Queda fuera del alcance del proyecto, pero necesita su plan aprobado antes de la compuerta G3 para no interrumpir el ciclo de mejora.
