UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS · OGPL · OFICINA DE RACIONALIZACIÓN

Plan de gestión de la Fase 2 · Despliegue de procedimientos (Anexo 1)

P01-PG-F2 · Versión 1.1

Código	P01-PG-F2
Versión	1.1 · 2026-10-08
Proyecto	P01 · Implementación de la Gestión por Procesos en la UNMSM
Fase	Fase 2 · Implementación
Estado	En validación
Partes validadas	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, A, B
Actividades cumplidas	0 de 17
Aprueba	Jefe de la OGPL
Compuerta	100 % de los procedimientos con acta de conformidad y cargados en SIGPRO, y MAPRO aprobado.
Última actualización	2026-10-13
Nota de versión	Primer despliegue: FDCP y FPSIC (grupo 1), FIEE y FCA (grupo 2). Los siguientes grupos entran como nueva versión de este plan (Anexo B.5).

Contenido

1. Datos del documento
2. 1. Propósito del plan
3. 2. Decisiones adoptadas en esta versión
4. 3. Enunciado del alcance
5. 4. Estructura de desglose del trabajo (EDT / WBS)
6. 5. Matriz de trazabilidad de requisitos
7. 6. Criterios de aceptación
8. 7. Roles y responsabilidades (RACI)
9. 8. Control de cambios
10. 9. Gestión del cronograma
11. 10. Gestión de la calidad
12. 11. Gestión de riesgos
13. 12. Interesados y comunicaciones
14. 13. Documentos que integran este plan
15. 14. Cronograma detallado de la Fase 2: Diagramación y Procedimentación
16. Anexo A. Correspondencia con la Guía del PMBOK 7.ª edición
17. Anexo B. Arquitectura de planes y gobernanza del proyecto P01

Datos del documento

Código	Versión	Fecha	Elaborado por	Aprobado por
P01-PG-F2	1.1 (v1.0: 30/09/2026)	08/10/2026	Analista Líder/Senior · Álvaro Rojas	Jefe de la OGPL

Estado del documento: secciones 1 a 3 validadas; secciones 4 a 14 y anexos en validación. Este plan forma parte de la arquitectura de planes de gestión del proyecto P01 descrita en el Anexo B; comparte con los demás planes de fase la misma estructura de 14 secciones, el Anexo A y el Anexo B.

1. Propósito del plan

El presente plan tiene como propósito establecer la hoja de ruta metodológica, técnica y operativa para el despliegue de la Fase 2: Documentación y Diagramación de Procedimientos, a ejecutarse en las facultades de Derecho y Ciencia Política (FDCP), Psicología (FPSIC), Ingeniería Electrónica y Eléctrica (FIEE) y Ciencias Administrativas (FCA), debido a su cumplimiento de la Fase 1 al 30 de septiembre de 2026. Este plan busca garantizar la transformación ordenada y estandarizada de los productos y procesos previamente inventariados en el Anexo 1, convirtiéndolos en procedimientos aprobados.

Para ello, el plan estructura el trabajo bajo tres ejes : la delimitación del orden de ejecución, la asignación de responsables de aprobación y la definición clara de los criterios de cierre de cada actividad. Asimismo, el propósito de esta fase se enfoca en la recopilación del estado actual (As-Is) de lo registrado, actuando como un marco de contención que no contempla el rediseño de procesos ni modificaciones al Mapa de Proceso Estándar.

De esta manera se garantizan entregas a tiempo y se deja la documentación lista para sumar a las demás facultades de forma progresiva, empleando la experiencia de este primer grupo.

2. Decisiones adoptadas en esta versión

A continuación se detallan nueve decisiones estratégicas y metodológicas que rigen la ejecución del presente plan de despliegue.

CÓDIGO	DECISIÓN ADOPTADA
D-01	**Documentación del Procedimiento:** Cada procedimiento se da por concluido únicamente al contar con sus dos componentes normativos: procedimiento documentado en texto y diagrama de flujo.
D-02	**Estandarización de notación BPMN 2.0:** Adopción obligatoria de la normativa internacional de Business Process Model and Notation (BPMN 2.0), la cual contiene: eventos de inicio/fin, tareas, compuertas exclusivas, flujos de secuencia y carriles/lanes.
D-03	**Coordinación para la programación de visitas y diagramación de procedimientos:** Reunión preliminar de coordinación con los decanos de las 4 facultades y sus jefes de las unidades orgánicas, para presentarles el cronograma de visita con cada uno de los jefes de las unidades orgánicas para diagramar sus procedimientos respectivos.
D-04	**Despliegue operativo y levantamiento de procesos en las facultades de Derecho y Ciencia Política (FDCP) y de Psicología (FPSIC):** Conforme al cronograma establecido, el equipo de racionalización se desplegará de manera paralela en ambas dependencias: Alvaro Rojas intervendrá en la Facultad de Derecho y Ciencia Política, en tanto que Isabel Flores y Oriol Romero cumplirán con la misma labor en la Facultad de Psicología. Dicha intervención comprenderá el inicio de la diagramación de los procesos correspondientes (PE, PM y PS).
D-05	**Análisis y establecimiento de los procedimientos To-Be (estándar) — FDCP y FPSIC:** Una vez concluida la diagramación de los dieciséis (16) procesos, se procederá al análisis técnico correspondiente con el fin de establecer los flujos optimizados (To-Be) bajo un estándar unificado.

CÓDIGO	DECISIÓN ADOPTADA
D-06	**Despliegue operativo y levantamiento de procesos en las facultades de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (FIEE) y de Ciencias Administrativas (FCA):** Conforme al cronograma establecido, el equipo de racionalización se desplegará de manera paralela en ambas dependencias: Alvaro Rojas y Oriol Romero intervendrá en la Facultad de Ciencias Administrativas, en tanto que Isabel Flores cumplirán con la misma labor en la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Dicha intervención comprenderá el inicio de la diagramación de los procesos correspondientes (PE, PM y PS).
D-07	**Análisis y establecimiento de los procedimientos To-Be (estándar) — FIEE y FCA:** Terminada la diagramación de los 16 procesos, se procederá a su análisis para establecer un procedimiento To-Be.
D-08	**Despliegue de las facultades que culminan después del 30 de setiembre:** Aquellas facultades que concluyan sus actividades mientras se esté desarrollando la procedimentación en FDCP, FPSIC, FIEE y FCA deberán aguardar la culminación de dicha fase para dar inicio al despliegue con los siguientes grupos de facultades.
D-09	**Métrica única de avance (Tablero de SIGPRO):** El seguimiento del progreso se realiza de forma exclusiva a través del Dashboard de SIGPRO, suprimiendo la elaboración de reportes de avance paralelos.

3. Enunciado del alcance

El presente alcance se enfoca en la ejecución de la Fase 2: Documentación y Diagramación de Procedimientos en las facultades de Derecho y Ciencia Política (FDCP), Psicología (FPSIC), Ingeniería Electrónica y Eléctrica (FIEE) y Ciencias Administrativas (FCA). A continuación, se detallan los elementos específicos que se encuentran comprendidos y excluidos dentro de esta fase del proyecto:

Dentro del alcance	Fuera del alcance
Procedimiento documentado en texto (proceso vinculado, código del procedimiento, nombre del procedimiento, descripción de la tarea, tarea predecesora, responsable y aprobación del jefe).	Documentación de la ficha técnica de la caracterización (Anexo 3).
Diagrama de flujo bajo la normativa BPMN 2.0 (carriles por responsable y compuertas de decisión).	Automatización o desarrollo de sistemas informáticos.
Análisis y establecimiento de los procedimientos To-Be.	Procedimentación de dependencias centrales.
Acta de conformidad de lo establecido en el flujograma y procedimiento documentado por cada dueño del proceso.	Elaboración o aprobación de Manuales de Procedimientos (MAPRO).
Todo procedimiento aprobado con el acta de conformidad será subido a SIGPRO, donde posteriormente será consolidado en el MAPRO.	Acta de conformidad de dependencias centrales o lotes fuera del alcance actual. Subida y consolidación en SIGPRO/MAPRO de procedimientos de dependencias centrales o fuera del alcance de la Fase 2 actual.

4. Estructura de desglose del trabajo (EDT / WBS)

La Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) organiza las intervenciones para el despliegue de la Fase 2 en las facultades FDCP, FPSIC, FIEE y FCA, alineándose con los estándares del PMI y la Guía del PMBOK (7.ª edición). Se aplica estrictamente la regla del 100 % y una orientación a componentes orientados a entregables y sustantivos tangibles. La estructura integra de manera coherente la gestión del proyecto, la procedimentación por grupos de facultades y los hitos del despliegue tecnológico de SIGPRO y consolidación del MAPRO.

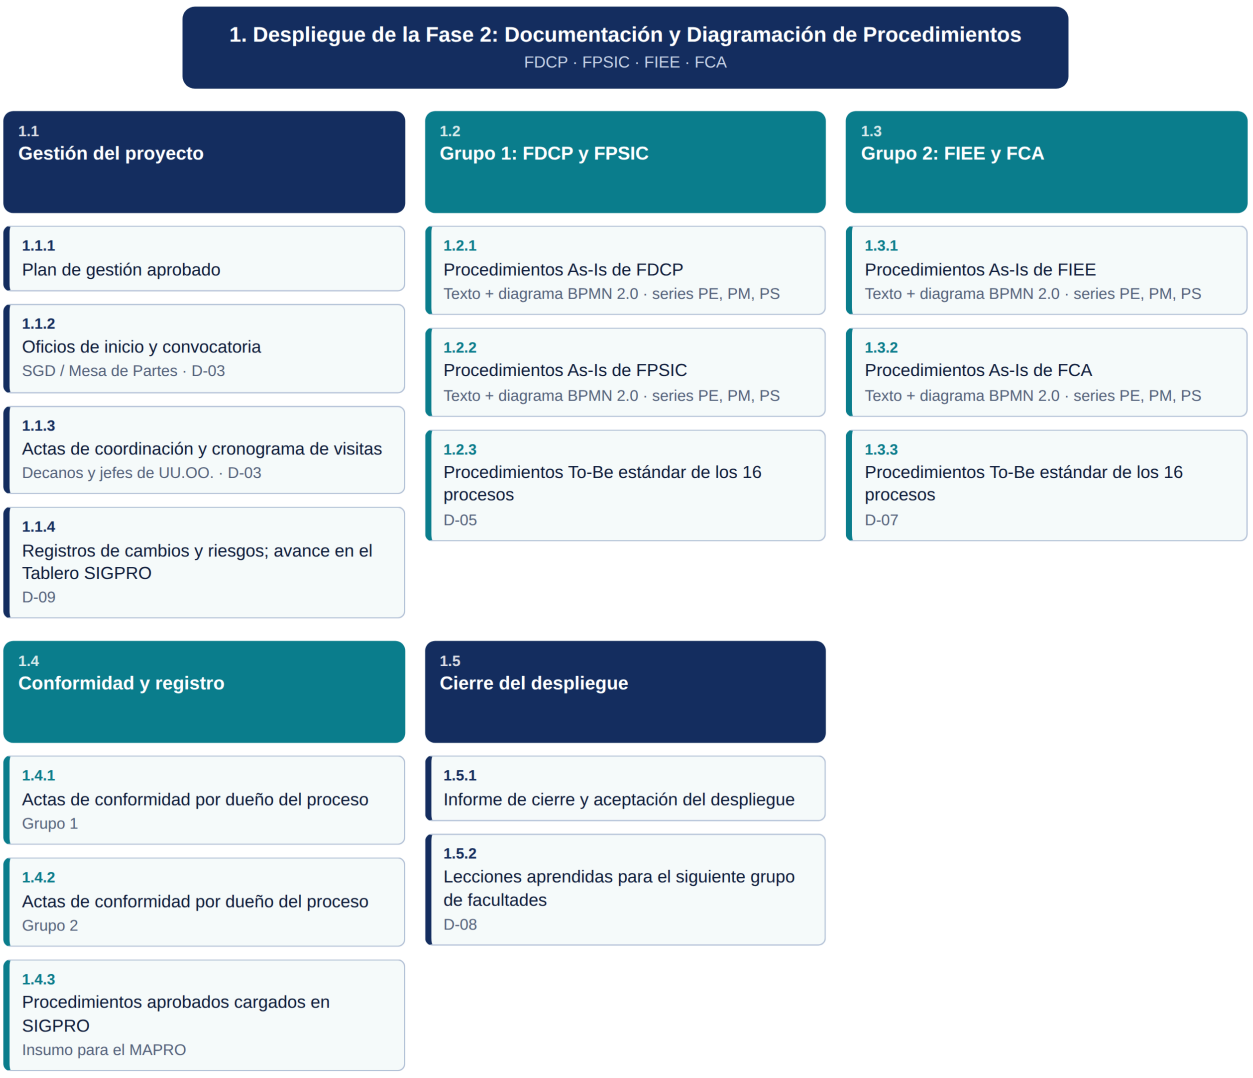


Figura 1. Estructura de desglose del trabajo de la Fase 2.

4.1 Diccionario de la EDT

CÓDIGO	ENTREGABLE	DESCRIPCIÓN Y CRITERIO DE TERMINADO	RESPONSABLE · DECISIÓN
1.1.1	Plan de gestión aprobado	Este documento, con las secciones 1 a 14 validadas por la Jefatura de la Oficina General de Planificación.	Jefe de la OGPL
1.1.2	Oficios de inicio y convocatoria	Oficios enviados por SGD / Mesa de Partes a los decanatos y jefaturas de las 4 facultades, con el cronograma de visitas adjunto.	Analistas de racionalización · D-03
1.1.3	Actas de coordinación y cronograma de visitas	Acta de la reunión con el decano y los jefes de unidades orgánicas de cada facultad, con las fechas de visita acordadas por unidad.	Analistas de racionalización · D-03
1.1.4	Registros de cambios y de riesgos; avance en el Tablero SIGPRO	Registros actualizados en cada reunión de seguimiento. El avance se publica solo en el Tablero de SIGPRO, sin reportes paralelos.	Analistas · D-09

CÓDIGO	ENTREGABLE	DESCRIPCIÓN Y CRITERIO DE TERMINADO	RESPONSABLE · DECISIÓN
1.2.1 / 1.2.2	Procedimientos As-Is de FDCP y de FPSIC	Por cada procedimiento de las series PE, PM y PS: texto con los 7 campos del alcance y diagrama BPMN 2.0 con carriles por responsable. Terminado = pasa la revisión de calidad (sección 10).	Alvaro Rojas (FDCP); Isabel Flores y Oriol Romero (FPSIC) · D-04
1.2.3	Procedimientos To-Be estándar · Grupo 1	Análisis comparativo de los 16 procesos diagramados en FDCP y FPSIC y propuesta de flujo estándar unificado, sin modificar el Mapa de Procesos Institucional.	Equipo de racionalización · D-05
1.3.1 / 1.3.2	Procedimientos As-Is de FIEE y de FCA	Mismo contenido y criterio que 1.2.1 y 1.2.2.	Alvaro Rojas y Oriol Romero ((FCA); Isabel Flores FIEE) · D-06
1.3.3	Procedimientos To-Be estándar · Grupo 2	Análisis comparativo de los 16 procesos diagramados en FIEE y FCA, partiendo del estándar del Grupo 1.	Equipo de racionalización · D-07
1.4.1 / 1.4.2	Actas de conformidad	Un acta por dueño del proceso que da conformidad al flujograma y al procedimiento documentado, sin observaciones abiertas.	Dueño del proceso (firma); analista (prepara)
1.4.3	Procedimientos aprobados cargados en SIGPRO	Todo procedimiento con acta queda cargado en SIGPRO como insumo de la futura consolidación del MAPRO.	Analistas de racionalización
1.5.1	Informe de cierre y aceptación	Resultados contra los criterios de aceptación (sección 6), cambios aprobados y riesgos materializados.	Analista Líder/Senior y Jefe de la OGPL
1.5.2	Lecciones aprendidas	Qué repetir y qué cambiar para el siguiente grupo de facultades (D-08).	Equipo de racionalización

5. Matriz de trazabilidad de requisitos

La matriz de trazabilidad une cada requisito con su origen, el entregable que lo satisface y la forma de verificarlo. Solo se incluyen requisitos que provienen de las secciones 1 a 3 validadas; si un requisito no se puede verificar sobre un entregable, no es requisito de este plan.

ID	REQUISITO	ORIGEN	ENTREGABLE (EDT)	CÓMO SE VERIFICA	PRIORIDAD
RQ-01	Cada procedimiento tiene texto documentado con los 7 campos: proceso vinculado, código, nombre, descripción de la tarea, tarea predecesora, responsable y aprobación del jefe.	D-01; Alcance	1.2.1, 1.2.2, 1.3.1, 1.3.2	Lista de control de los 7 campos sobre el 100 % de los procedimientos	Alta
RQ-02	Cada procedimiento tiene su diagrama de flujo y ambos describen las mismas tareas.	D-01	Ídem	Cotejo tarea por tarea entre texto y diagrama	Alta
RQ-03	Los diagramas usan BPMN 2.0 con los elementos definidos: eventos de inicio y fin, tareas, compuertas exclusivas, flujos de secuencia y carriles.	D-02	Ídem	Lista de verificación de notación (sección 10)	Alta
RQ-04	Se documenta el estado actual (As-Is) sin rediseñar procesos ni modificar el Mapa de Procesos Estándar.	Sección 1	Ídem	Revisión del Jefe de la OGPL antes del To-Be	Alta
RQ-05	Cada grupo cuenta con procedimientos To-Be bajo un estándar unificado para los 16 procesos.	D-05, D-07	1.2.3, 1.3.3	Documento To-Be aceptado por el Jefe de la OGPL	Alta
RQ-06	Cada procedimiento tiene acta de conformidad de su dueño del proceso.	Alcance	1.4.1, 1.4.2	Acta firmada y archivada por procedimiento	Alta

ID	REQUISITO	ORIGEN	ENTREGABLE (EDT)	CÓMO SE VERIFICA	PRIORIDAD
RQ-07	Todo procedimiento con acta queda cargado en SIGPRO.	Alcance	1.4.3	Conteo: procedimientos en SIGPRO = procedimientos con acta	Media
RQ-08	El avance se mide solo en el Tablero de SIGPRO, sin reportes paralelos.	D-09	1.1.4	El tablero refleja el mismo conteo que las actas	Media
RQ-09	**Las facultades que cerraron la Fase 1 después del 30 de setiembre no entran en este despliegue.**	D-08	—	Control de cambios: ninguna facultad nueva sin decisión formal	Media

6. Criterios de aceptación

El PMBOK 7 pide definir de antemano cuándo un entregable está terminado (dominio de Entrega) y quién lo acepta. Se aceptan tres niveles: el procedimiento, el To-Be de cada grupo y la facultad completa. No hay aceptación parcial: un criterio incumplido devuelve el entregable.

ID	CRITERIO	UMBRAL	CÓMO SE COMPRUEBA	QUIÉN ACEPTA
CA-01	Completitud del procedimiento	Los 7 campos llenos en el 100 % de las tareas	Lista de control RQ-01	Analista revisor · Álvaro Rojas
CA-02	Conformidad de la notación BPMN 2.0	0 hallazgos graves y hasta 2 leves por diagrama	Lista de verificación de la sección 10	Analista revisor · Álvaro Rojas
CA-03	Correspondencia texto–diagrama	100 % de las tareas del texto están en el diagrama y viceversa	Cotejo tarea por tarea	Analista revisor · Álvaro Rojas
CA-04	Codificación	100 % de los códigos válidos	Cotejo y verificación de la codificación con el Proceso 0, 1 y Producto	Equipo de racionalización
CA-05	Conformidad del dueño del proceso	Acta firmada sin observaciones abiertas	Reunión de validación con acta	Dueño del proceso (jefe de la unidad orgánica)
CA-06	Registro en SIGPRO	Cargado dentro de los 3 días hábiles siguientes al acta	Consulta en SIGPRO y Tablero	Equipo de racionalización
CA-07	To-Be del grupo	Estándar único para los 16 procesos, con las variantes por facultad justificadas	Revisión del documento To-Be	Jefe de la OGPL
CA-08	Cierre de la facultad	100 % de sus procedimientos con CA-01 a CA-06 cumplidos	Conteo en el Tablero de SIGPRO	Equipo de racionalización

Hallazgo grave: impide usar el procedimiento (tarea sin responsable, diagrama que no corresponde al texto, código inexistente). **Hallazgo leve:** no impide usarlo (rótulo mal escrito, formato de fecha, un símbolo fuera del conjunto de D-02).

7. Roles y responsabilidades (RACI)

Corresponde al dominio de desempeño del Equipo y al principio de liderazgo del PMBOK 7. Según las decisiones validadas, el equipo de racionalización levanta, diagrama y documenta (D-04 y D-06); la facultad aporta el conocimiento de su operación y da la conformidad. Así cada parte responde por lo que conoce: la OGPL por el método y la facultad por el contenido.

ENTREGABLE (EDT)	JEFE OGPL	ANALISTA LÍDER/SENIOR	ANALISTAS DE RACIONALIZACIÓN	DECANO	JEFE DE UU.OO. (DUEÑO DEL PROCESO)
1.1.1 Plan de gestión	A*	A	R	I	I
1.1.2 Oficios de inicio (SGD / Mesa de Partes)	A*	A	R	I	I
1.1.3 Reunión de coordinación y cronograma de visitas	I	R	R	C	C
1.1.4 Registros y Tablero SIGPRO	I	I	R	–	–
1.2.1–1.3.2 Procedimientos As-Is (texto y diagrama)	I	I	R	I	C
1.2.3 y 1.3.3 Procedimientos To-Be estándar	I	A	R	I	C
1.4.1 y 1.4.2 Actas de conformidad	I	C	R	I	A
1.4.3 Carga en SIGPRO	I	A	R	–	I
Control de cambios (sección 8)	A*	A	R	C	I
1.5 Cierre y lecciones aprendidas	A	R	R	I	I

R: lo hace · A: aprueba técnicamente y responde por el resultado · A*: aprobación final del Jefe de la OGPL, solo en los entregables y cambios de su umbral (sección 8) · C: se le consulta antes · I: se le informa después · –: no participa.

7.1 Asignación del equipo

GRUPO	FACULTAD	ANALISTA ASIGNADO
Grupo 1 (D-04)	Derecho y Ciencia Política (FDCP)	Alvaro Rojas
Grupo 1 (D-04)	Psicología (FPSIC)	Isabel Flores y Oriol Romero
Grupo 2 (D-06)	Ingeniería Electrónica y Eléctrica (FIEE)	Isabel Flores
Grupo 2 (D-06)	Ciencias Administrativas (FCA)	Alvaro Rojas y Oriol Romero

Dedicación esperada. Analistas: tiempo completo durante su grupo. Dueño del proceso: una sesión de levantamiento y una de validación por procedimiento. Decano: reunión de coordinación y escalamientos.

7.2 Funciones del equipo de trabajo

Analista Líder/Senior · Álvaro Rojas. Conducir el diseño arquitectónico de los procesos institucionales mediante el mapeo, el modelamiento bajo el estándar BPMN 2.0 y el desarrollo de fichas de caracterización e indicadores. Asimismo, brindar acompañamiento técnico-metodológico para asegurar la correcta implementación del enfoque de gestión por procesos en la organización.

Actividades:

- Diseñar, estandarizar y actualizar el marco metodológico de la gestión por procesos (Plan de Gestión, Guía Práctica N.º 001, fichas de caracterización, diseño de indicadores y otros documentos), garantizando su alineamiento con los objetivos institucionales.
- Asesorar y brindar acompañamiento técnico especializado de manera continua a los responsables de procesos en las 20 facultades de la UNMSM, facilitando la transferencia de conocimientos y la correcta

adopción del modelo.
- Conducir y auditar la diagramación de flujos de procesos bajo el estándar BPMN 2.0 (empleando herramientas como Bizagi Modeler), validando rigurosamente la coherencia de entradas, salidas, controles, normativas y responsables del Mapa Estándar.
- Liderar, coordinar y controlar el desempeño y las actividades operativas del equipo de trabajo, asegurando la calidad técnica de los entregables y el cumplimiento del cronograma.
- Definir y coordinar estratégicamente con el equipo de desarrollo y programación las especificaciones funcionales, reglas de negocio y arquitecturas de flujo que debe reflejar el Sistema de Gestión por Procesos, identificando además oportunidades de integración y automatización (RPA).
- Consolidar el análisis de datos sobre los avances porcentuales, gestionar el levantamiento de observaciones técnicas y reportar mensualmente el progreso a la Jefatura de la OGPL mediante dashboards dinámicos y reportes ejecutivos.

Analista Técnico en Relevamiento de Procesos · Isabel Flores (Analista Junior · Oficina de Racionalización – OGPL). Apoyo operativo y de campo.

- Programar y realizar las visitas y entrevistas de levantamiento con los jefes de unidades orgánicas y los dueños de proceso.
- Levantar el estado actual (As-Is) y diagramarlo en BPMN 2.0 bajo la supervisión del Analista Líder/Senior.
- Redactar el procedimiento documentado y verificar la correspondencia entre el texto y el diagrama antes de la revisión.
- Preparar los borradores para validación y las actas de conformidad, y registrar las observaciones de campo.

Entregables: procedimientos As-Is (texto y diagrama) de la facultad asignada, actas de visita y actas de conformidad preparadas para firma.

Analista Operativo en Documentación y Seguimiento · Oriol Romero (Analista Junior · Oficina de Racionalización – OGPL).

- Mantener el repositorio documental, la nomenclatura y el control de versiones de los entregables.
- Registrar el avance y cargar en SIGPRO los documentos y procedimientos aprobados; mantener al día los datos que alimentan el Dashboard.
- Actualizar los registros de decisiones, cambios, riesgos y acuerdos después de cada reunión de seguimiento.
- Apoyar el levantamiento y la diagramación en la facultad asignada y participar en la revisión cruzada de notación.

Entregables: repositorio ordenado y versionado, cargas en SIGPRO conformes, registros actualizados e insumos del Dashboard.

8. Control de cambios

Todo cambio al alcance, al cronograma o a las decisiones de la sección 2 entra por solicitud escrita y queda en el registro de cambios. Un cambio aplicado sin registro no se reconoce en la aceptación.

8.1 Umbrales de autoridad

Tipo de cambio	Quién resuelve	Plazo de respuesta
Corrección de forma en un entregable ya aceptado	Analista asignado	En el acto
Procedimiento que entra o sale de una facultad, o ajuste del To-Be	Equipo de racionalización (Analista Líder/Senior)	3 días hábiles
Movimiento de un hito dentro de la ventana de P01 (hasta el 15 de enero de 2027)	Equipo de racionalización (Analista Líder/Senior)	3 días hábiles

Tipo de cambio	Quién resuelve	Plazo de respuesta
Hito que sale de la ventana de P01, cambio de notación o de una decisión D-0x	Jefe de la OGPL	5 días hábiles

8.2 Flujo

1. Quien detecta la necesidad llena la solicitud y la remite por SGD: qué cambia, por qué, qué entregables toca y qué pasa si no se aprueba.
2. El analista asignado estima el efecto en plazo y esfuerzo en 2 a 5 días hábiles. Sin efecto estimado, la solicitud no se somete a decisión.
3. La autoridad del umbral aprueba, rechaza o pide más información.
4. Si se aprueba, se actualizan en este orden: cronograma, matriz de trazabilidad y registro de cambios.
5. La decisión se comunica mediante el sistema SIGPRO, se apruebe o no.

Registro. Una fila por solicitud: código, fecha, solicitante, descripción, efecto estimado en días, decisión, fecha de decisión y entregables actualizados.

9. Gestión del cronograma

El plan es híbrido: predictivo en el método (las mismas etapas para todas las facultades) e incremental en la entrega, por grupos que producen procedimientos utilizables antes del cierre. En Planificación, las fechas se ajustan a la ventana que el cronograma de P01 fija para esta fase: diagramación del 16 de octubre al 30 de noviembre de 2026 y validación del 1 de diciembre de 2026 al 15 de enero de 2027.

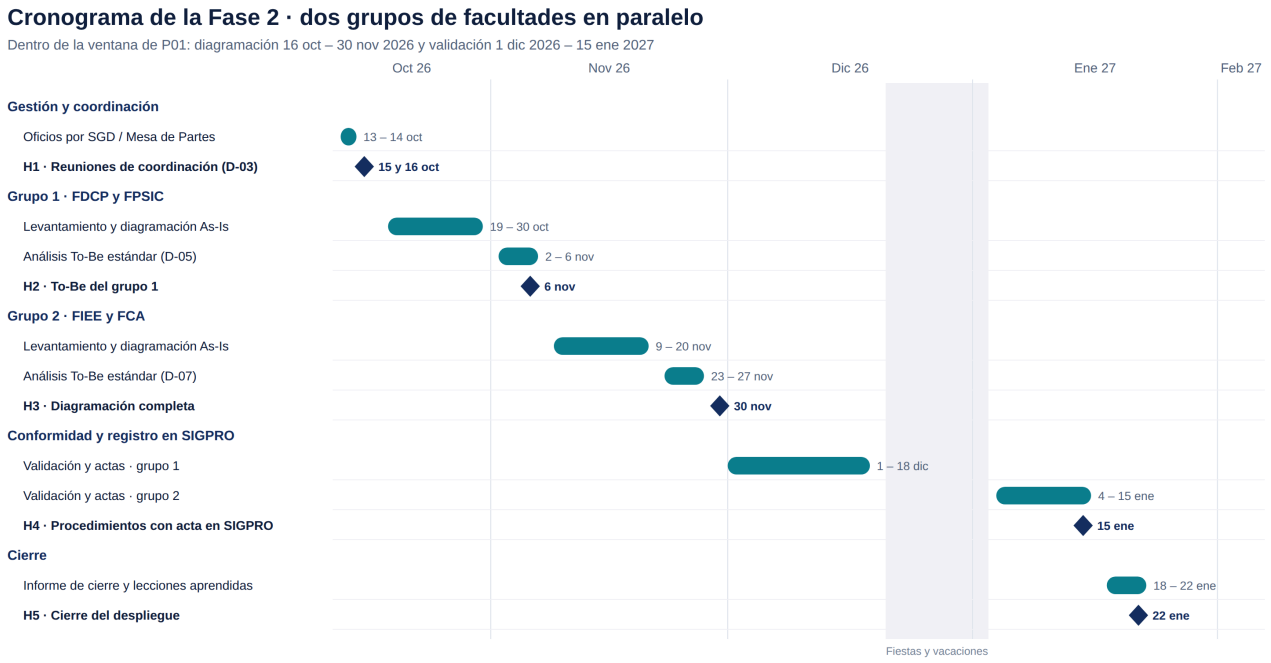


Figura 2. Cronograma propuesto de la Fase 2 por grupos.

9.1 Hitos

Hito	Descripción	Fecha	Evidencia	Estado
H0	Oficios enviados por SGD / Mesa de Partes; recepción y convocatoria	13 y 14/10/2026	Cargo de los oficios	Pendiente

Hito	Descripción	Fecha	Evidencia	Estado
H1	Reuniones de coordinación con decanos y jefes de UU.OO. (D-03): FDCP y FCA el 15/10; FPSIC y FIEE el 16/10	15 y 16/10/2026	Actas y cronograma de visitas	Pendiente
H2	Procedimientos To-Be estándar del Grupo 1 (D-05)	06/11/2026	Documento To-Be aceptado (CA-07)	Pendiente
H3	Diagramación completa de las 4 facultades	30/11/2026	Tablero SIGPRO	Pendiente
H4	Todos los procedimientos con acta y cargados en SIGPRO	15/01/2027	Actas y Tablero SIGPRO	Pendiente
H5	Cierre del despliegue y lecciones aprendidas	22/01/2027	Informe de cierre	Pendiente

9.2 Supuestos y restricciones

- **Restricción:** la ventana de P01 (16/10/2026 – 15/01/2027). Salir de ella es un cambio de umbral del Jefe de la OGPL.
- **Supuesto:** el Grupo 2 lo atiende el mismo equipo después del Grupo 1, porque los dos grupos comparten analistas.
- **Supuesto:** el Anexo 1 de cada facultad está cerrado al iniciar su grupo.
- **Restricción:** del 21 de diciembre al 3 de enero no se programan validaciones (fiestas y vacaciones); los feriados del 8, 9 y 25 de diciembre y del 1 de enero no cuentan como días hábiles.
- **Dependencia externa:** la carga en SIGPRO necesita los módulos de evidencia y de acta digital, programados en P01 hasta el 20/11/2026.

9.3 Control del avance

El avance se calcula sobre procedimientos cerrados (CA-01 a CA-06), no sobre procedimientos iniciados, y su única fuente es el Tablero de SIGPRO (D-09). Una desviación de más de 5 días hábiles sobre un hito se trata como solicitud de cambio (sección 8). Las fechas son propuestas y se confirman al aprobar el plan y conocer el número de procedimientos por facultad.

10. Gestión de la calidad

Esta sección incorpora la calidad en los procesos y en los entregables y aplica el dominio de Medición. La calidad se controla durante cada grupo, no al final: un lote revisado solo al cierre concentra las devoluciones en el peor momento y retrasa la validación con los dueños del proceso.

#	Métrica	Umbral	Cuándo se mide	Si no se cumple
Q-01	Errores de diagramación por procedimiento en la revisión interna	≤ 1 en promedio	Al revisar cada procedimiento	Sesión de calibración entre analistas antes de seguir
Q-02	Diagramas sin hallazgo grave	≥ 90 %	Semanal	Revisión en pareja de los 5 diagramas siguientes
Q-03	Correspondencia texto–diagrama	100 %	Al revisar cada procedimiento	El procedimiento vuelve al analista y no cuenta como avance
Q-04	Observaciones del dueño del proceso en la validación	≤ 2 por procedimiento	En cada reunión de validación	Se revisa el levantamiento de esa unidad antes de seguir
Q-05	Demora por antigüedad en la revisión de diagramación	Ninguno más de 3 días hábiles en espera	Semanal	Se reasigna revisor

Revisión cruzada. Cada analista revisa los diagramas de la otra facultad de su grupo; quien diagrama no revisa su propio trabajo. El revisor no corrige: devuelve con los hallazgos.

Lista de verificación de notación BPMN 2.0 (D-02).

1. Un evento de inicio y al menos uno de fin.
2. Cada tarea con verbo en infinitivo y un solo responsable.
3. Cada compuerta exclusiva con sus salidas rotuladas.
4. Un carril por responsable, sin carriles vacíos.
5. Ningún flujo de secuencia suelto ni tarea sin conexión.
6. Solo los elementos definidos en D-02.

11. Gestión de riesgos

Corresponde al dominio de Incertidumbre y al principio «optimizar las respuestas a los riesgos». La exposición es probabilidad × impacto, ambos de 1 a 5 (alta ≥ 15, media 8 a 14, baja ≤ 7). Las estrategias son las del PMBOK 7: para amenazas, escalar, evitar, transferir, mitigar o aceptar; para oportunidades, escalar, explotar, compartir, mejorar o aceptar. El registro se revisa en cada reunión de seguimiento y al cierre de cada grupo.

ID	Riesgo	P	I	Exp.	Estrategia	Respuesta	Propietario
R-01	Los jefes de unidades orgánicas no asisten a las visitas de levantamiento o validación	4	4	16	Mitigar	Cronograma de visitas acordado en la reunión D-03; reprogramar dentro de 3 días; a la segunda ausencia se escala al decano	Analista Líder/Senior
R-02	Los nombres de los productos catalogados en el Anexo 1 de alguna facultad están errados, incompletos o con códigos inconsistentes al iniciar su grupo	3	5	15	Mitigar	Cotejar el Anexo 1 una semana antes de cada grupo y corregir con la facultad	Analista asignado
R-03	Los módulos de evidencia y acta digital de SIGPRO no están listos y no se pueden cargar los procedimientos	3	4	12	Escalar	Depende del desarrollador full-stack: se le notifica la urgencia; mientras tanto se archiva en el repositorio de la fase	Equipo de racionalización
R-04	Las validaciones de diciembre y enero se cruzan con fiestas, vacaciones y cierre de semestre	4	3	12	Aceptar (activa)	Validar el Grupo 1 antes del 18/12 y el Grupo 2 desde el 04/01; reservar 2 días de holgura	Analista asignado
R-05	Las prácticas de las facultades difieren tanto que no admiten un To-Be único	3	3	9	Mitigar	Estándar común con variantes justificadas por facultad (CA-07)	Equipo de racionalización
R-06	Ausencia o rotación de un analista en un equipo de tres personas	2	5	10	Mitigar	Revisión cruzada y repositorio al día, para que otro analista continúe sin retrabajo	Analista Líder/Senior
R-07	Cambio de herramienta de diagramación durante la fase	3	3	9	Mitigar	Plantilla única y solo los elementos de D-02, que cualquier herramienta BPMN 2.0 conserva	Analistas
R-08	Se pide incorporar facultades que cerraron la Fase 1 después del 30 de setiembre	3	3	9	Evitar	Aplicar D-08: toda ampliación entra por control de cambios con decisión del Jefe de la OGPL	Analista Líder/Senior
O-01	Oportunidad: el To-Be del Grupo 1 sirve de base para el Grupo 2 y acorta su análisis	4	3	12	Explotar	Partir del estándar de D-05 en D-07 y documentar solo las diferencias	Equipo de racionalización

Los riesgos R-01 y R-02 pueden detener el arranque, y ambos se resuelven antes de abrir cada grupo. R-03 no depende de este equipo: por eso su estrategia es escalar y no mitigar.

12. Interesados y comunicaciones

Esta sección identifica, comprende, prioriza e involucra a los interesados y vigila si su compromiso cambia. El compromiso se clasifica en cinco niveles: desconocedor, reticente, neutral, partidario y líder. La tabla

compara el nivel estimado al inicio (A) con el deseado (D).

Interesado	Interés principal	Influencia	Compromiso A → D	Estrategia de involucramiento
Jefe de la OGPL	Cumplir la fase dentro de la ventana de P01	Alta	Partidario → Líder	Decisiones rápidas sobre escalamientos; aprueba los entregables To-Be
Decanos de FDCP, FPSIC, FIEE y FCA	Poca carga para su personal	Alta	Neutral → Partidario	Reunión D-03 con fechas concretas y resultados por unidad
Jefes de unidades orgánicas (dueños del proceso)	Que el procedimiento refleje su operación real	Media	Neutral → Partidario	Sesiones cortas, borrador para validar y acta de conformidad
Analistas de racionalización	Criterios claros y estables	Media	Partidario → Líder	Listas de verificación, revisión cruzada y calibración
Equipo SIGPRO (P01)	Uso del sistema y del tablero	Media	Partidario → Partidario	Coordinación de la carga y de los módulos que se necesitan
Facultades que esperan su turno (D-08)	Saber cuándo empiezan	Baja	Desconocedor → Neutral	Comunicar el calendario del siguiente grupo al cierre

12.1 Matriz de comunicaciones

Por D-09, el avance se consulta en el Tablero de SIGPRO y no se elaboran reportes de avance paralelos: las reuniones usan el tablero como fuente.

Qué se comunica	A quién	Frecuencia	Medio	Responsable
Inicio de la fase y cronograma de visitas	Decanatos y jefaturas	Una vez, al inicio	Oficio SGD / Mesa de Partes	Analista Líder/Senior
Plan de trabajo y fechas por unidad	Decano y jefes de UU.OO.	Al abrir cada grupo	Reunión con acta (D-03)	Analista asignado
Avance, cola de revisión y métricas Q-01 a Q-05	Analista Líder/Senior	Semanal	Tablero SIGPRO y reunión de 30 min	Analista asignado
Hitos, riesgos altos y cambios	Jefe de la OGPL	Quincenal y ante escalamiento	Tablero SIGPRO y reunión de 30 min	Analista Líder/Senior
Borrador del procedimiento para validar	Dueño del proceso	Por procedimiento	Sesión de validación con acta	Analista asignado
Cierre del grupo y de la fase	Decanos y Jefe de la OGPL	Al cerrar cada grupo	Informe de cierre	Analista Líder/Senior

Escalamiento. Un bloqueo que no se resuelve en 3 días hábiles sube al Analista Líder/Senior; si pasa de 5, al Jefe de la OGPL; si involucra a una facultad, se informa al decano.

13. Documentos que integran este plan

El presente plan agrupa los artefactos en categorías: estrategia, registros, planes, jerarquías, líneas base, datos visuales, acuerdos e informes. Este plan prevalece sobre los demás documentos de la fase: si alguno lo contradice, manda el plan hasta que el cambio pase por la sección 8.

#	Documento	Categoría PMBOK 7	Para qué sirve	Quién lo mantiene
1	Plan de gestión (este documento)	Plan	Fija cómo se ejecuta y controla la fase	Analista Líder/Senior

#	Documento	Categoría PMBOK 7	Para qué sirve	Quién lo mantiene
2	EDT y diccionario (sección 4)	Jerarquía y línea base	Define el alcance en entregables	Analistas
3	Cronograma e hitos (sección 9)	Línea base y datos visuales	Fechas de referencia para medir el avance	Analista Líder/Senior
4	Matriz de trazabilidad (sección 5)	Registro	Une requisitos, entregables y verificación	Analistas
5	Matriz RACI (sección 7)	Jerarquía	Quién hace, aprueba, opina y se entera	Analista Líder/Senior
6	Registro de cambios (sección 8)	Registro	Qué cambió, por qué y quién lo aprobó	Analista asignado
7	Registro de riesgos (sección 11)	Registro	Amenazas, oportunidades y respuestas	Analista Líder/Senior
8	Registro de interesados y matriz de comunicaciones (sección 12)	Registro y plan	Con quién, qué y cuándo se comunica	Analistas
9	Plantillas de procedimiento y lista de verificación BPMN 2.0	Estrategia (estándar)	Que todas las facultades tengan el mismo formato	Analista Líder/Senior
10	Tablero de SIGPRO	Datos visuales	Única fuente del avance (D-09)	Equipo SIGPRO y analistas
11	Informe de cierre y lecciones aprendidas	Informe	Aceptación de la fase y mejora para el siguiente grupo	Analista Líder/Senior y Jefe de la OGPL

Las actas de coordinación y de conformidad no figuran como documentos de gestión: son entregables del alcance (EDT 1.1.3, 1.4.1 y 1.4.2). Los documentos de gestión se guardan en la carpeta del proyecto P01 (01 Planificación, 02 Reuniones y 03 Entregables) y los procedimientos aprobados, en SIGPRO.

14. Cronograma detallado de la Fase 2: Diagramación y Procedimentación

Baja los hitos de la sección 9 a actividades por grupo y responsable. Las dos facultades de cada grupo avanzan en paralelo (D-04 y D-06); el Grupo 2 empieza cuando el equipo termina el To-Be del Grupo 1.

Fechas	Actividad	Facultades	Responsable	Estado
13/10 – 14/10/2026	Oficios de inicio por SGD / Mesa de Partes; recepción y convocatoria	FDCP, FPSIC, FIEE, FCA	Analista Líder/Senior	Pendiente
15/10/2026	Reunión de coordinación con el decano y los jefes de UU.OO. (D-03)	FDCP y FCA	Analista Líder/Senior	Pendiente
16/10/2026	Reunión de coordinación con el decano y los jefes de UU.OO. (D-03)	FPSIC y FIEE	Analistas	Pendiente
19/10 – 30/10/2026	Levantamiento As-Is, diagramación BPMN 2.0 y texto de los procedimientos (series PE, PM y PS); revisión cruzada semanal	FDCP FPSIC	Álvaro Rojas (FDCP) Isabel Flores y Oriol Romero (FPSIC)	Pendiente
02/11 – 06/11/2026	Análisis To-Be estándar de los 16 procesos (D-05)	FDCP y FPSIC	Equipo de racionalización	Pendiente
09/11 – 20/11/2026	Levantamiento As-Is, diagramación y texto (D-06)	FCA FIEE	Álvaro Rojas (FCA) Isabel Flores y Oriol Romero (FIEE)	Pendiente

Fechas	Actividad	Facultades	Responsable	Estado
23/11 – 27/11/2026	Análisis To-Be estándar de los 16 procesos (D-07), partiendo del Grupo 1	FIEE y FCA	Equipo de racionalización	Pendiente
30/11/2026	Holgura y consolidación para validar (H3)	Todas	Analistas	Pendiente
01/12 – 18/12/2026	Validación con los dueños del proceso, actas de conformidad y carga en SIGPRO	FDCP y FPSIC	Analistas y jefes de UU.OO.	Pendiente
04/01 – 15/01/2027	Validación, actas de conformidad y carga en SIGPRO (H4)	FIEE y FCA	Analistas y jefes de UU.OO.	Pendiente
18/01 – 22/01/2027	Informe de cierre y lecciones aprendidas (H5)	Todas	Analista Líder/Senior y Jefe de la OGPL	Pendiente

Anexo A. Correspondencia con la Guía del PMBOK 7.ª edición

La 7.ª edición del PMBOK organiza la dirección de proyectos en 12 principios y 8 dominios de desempeño, y trata los documentos como artefactos adaptables. Todos los planes de fase usan la misma correspondencia:

Dominio de desempeño	Dónde se aplica en el plan	Principios relacionados
Interesados	Sección 12	Involucrarse eficazmente con los interesados
Equipo	Sección 7	Equipo colaborativo; liderazgo
Enfoque de desarrollo y ciclo de vida	Sección 9	Adaptar según el contexto (tailoring)
Planificación	Secciones 4, 9 y 14	Pensamiento sistémico; enfocarse en el valor
Trabajo del proyecto	Secciones 8 y 13	Administración responsable (stewardship)
Entrega	Secciones 5 y 6	Enfocarse en el valor; incorporar la calidad
Medición	Secciones 9 y 10	Incorporar la calidad en procesos y entregables
Incertidumbre	Sección 11	Optimizar las respuestas a los riesgos; adaptabilidad y resiliencia; permitir el cambio

Anexo B. Arquitectura de planes y gobernanza del proyecto P01

Este anexo es **idéntico en todos los planes de fase**. Define cómo se relacionan los planes entre sí, qué decide cada instancia y qué debe cumplirse para pasar de una fase a la siguiente. En la Guía del PMBOK 7 corresponde a la gobernanza del proyecto (dominio de Planificación y principio de administración responsable).

B.1 Planes que integran el proyecto

NIVEL	DOCUMENTO	QUÉ GOBIERNA	ESTADO AL 08/10/2026
Proyecto	Acta de constitución y cronograma maestro de P01	Objetivo, fases, hitos de compuerta y presupuesto. Prevalece sobre los planes de fase.	Vigente (sistema Gestión y SIGPRO)
Fase 1 · Identificación	P01-PG-F1	MAGPROF de las 20 facultades, Mapa Estándar, Anexos 1 y 3, indicadores estándar y SIGPRO en modo consulta.	v3.0 para validación (cierre de fase)

NIVEL	DOCUMENTO	QUÉ GOBIERNA	ESTADO AL 08/10/2026
Fase 2 · Implementación	P01-PG-F2	Procedimientos (texto y diagrama BPMN 2.0), To-Be estándar, actas de conformidad y carga en SIGPRO, por grupos de facultades.	v1.1 · secciones 1 a 3 validadas
Fase 3 · Evaluación	P01-PG-F3	Medición de indicadores, auditoría interna e informe de evaluación de indicadores críticos y no registrados.	Por elaborar antes de la compuerta G2
Fase 4 · Mejora	P01-PG-F4	Mejora continua a partir del informe de evaluación. Plan independiente: el alcance del proyecto no incluye la Fase 4.	Por elaborar antes de la compuerta G3

B.2 Reglas comunes a todos los planes

1. **Misma estructura.** Las 14 secciones, el Anexo A y este Anexo B se mantienen en todos los planes, aunque una sección quede breve. Así cualquier persona encuentra lo mismo en el mismo lugar.
2. **Jerarquía.** Un plan de fase no contradice al acta ni al cronograma maestro del proyecto. Si lo hace, prevalece el nivel superior hasta que el cambio se apruebe (sección 8).
3. **Códigos con prefijo de fase.** Fuera de su propio plan, las decisiones, requisitos y elementos de la EDT se citan con el prefijo de su fase (por ejemplo, F1-D-04 o F2-1.2.3), porque cada plan numera desde 1.
4. **Una sola fuente de avance.** El avance de todas las fases se publica en el Dashboard / Tablero de SIGPRO; no se elaboran reportes paralelos.
5. **Versiones.** Cada plan tiene un código P01-PG-Fn. La versión sube de número entero al aprobarse y de decimal al corregirse; cada versión registra en su sección 2 las decisiones nuevas con su fecha.
6. **Dónde vive cada plan.** El Word editable en la carpeta del proyecto P01 en Drive (01 Planificación); la versión vigente en el módulo de Documentación de SIGPRO; y su estado, en la pestaña Gobernanza del sistema Gestión.

B.3 Compuertas entre fases

Por la decisión F1-D-04, ninguna facultad pasa a la fase siguiente sin completar al 100 % la fase previa. Las compuertas se evalúan **por facultad**: cada facultad cruza su compuerta cuando cumple, sin esperar a las demás.

COMPUERTA	ENTRE	CRITERIO DE PASO	EVIDENCIA	DECIDE
G1	Fase 1 → Fase 2	100 % de los Anexos 1 y 3 registrados (avance por facultad = 0,5 × Anexo 1 + 0,5 × Anexo 3) y MAGPROF validado.	Dashboard de SIGPRO y expediente del MAGPROF	Jefe de la OGPL
G2	Fase 2 → Fase 3	100 % de los procedimientos con acta de conformidad y cargados en SIGPRO; MAPRO aprobado.	Tablero de SIGPRO y resolución del MAPRO	Jefe de la OGPL
G3	Fase 3 → Fase 4	Informe de evaluación de indicadores aprobado, con brechas y desviaciones identificadas.	Informe de evaluación	Jefe de la OGPL, con conocimiento de la DGA

B.4 Instancias de decisión y escalamiento

INSTANCIA	DECIDE	PLAZO Y ESCALAMIENTO
Jefe de la OGPL	Aprueba los planes, las compuertas, los cambios de alcance de una fase, de un hito de compuerta o de una decisión D-0x.	5 días hábiles
Analista Líder/Senior	Dirige al equipo; aprueba técnicamente los entregables y los cambios dentro de la fase que no mueven hitos de compuerta ni decisiones.	3 días hábiles; si no se resuelve, sube al Jefe de la OGPL

INSTANCIA	DECIDE	PLAZO Y ESCALAMIENTO
Analistas de racionalización	Resuelven correcciones de forma y proponen cambios con su efecto estimado.	En el acto
Decano y Consejo de Facultad	Aprueban el MAGPROF y el MAPRO de su facultad (Resolución Decanal).	Según la ruta de aprobación F1-D-07
Dirección General de Administración	Ratifica los manuales mediante Resolución Directoral.	Según la ruta de aprobación F1-D-07
Responsable de GxP y dueños de proceso	Registran la documentación de su facultad y dan conformidad a sus procedimientos.	Un bloqueo de facultad se informa al decano
